



Société d'Ingénierie de l'Environnement et de l'Energie

Agence de Réhabilitation et de rénovation Urbaine

N° Doc. I2E

Rpt_final

Rév : 1

Page : 72

PROGRAMME DE REHABILITATION DES QUARTIERS POPULAIRES POUR LA REDUCTION DES DISPARITES REGIONALES

ETUDE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DANS 29 QUARTIERS REPARTIS EN 10 LOTS

LOT 8 : TEBOURBA, MORNAGUIA, OUED ELLIL, EL FAHS

**Phase 2 : Elaboration du Plan Environnemental et Sociale
Quartier TAREK IBN ZIED de la commune MORNAGUIA**

Rapport Final

PGES validé et publication autorisée

1	28/12/2016	Rapport final	AS	SA	AGH
0	05/12/2016	Rapport provisoire	AS	SA	AGH
Rév	Date	Désignation	Emetteur	Vérificateur	Approbateur

Société de l'Ingénierie de l'Environnement & de l'Energie

Adresse : Rue de l'Argent, Imm.Fatma, Les Jardins du Lac-1053, Tunis-Tunisie/Tél : +216 71 192 015/Fax : +216 71 192 415

RESUME NON TECHNIQUE

Ce document constitue le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet de réhabilitation du quartier Tarek Ibn Zied.

Description du projet

Le projet consiste à réhabiliter le quartier Tarek Ibn Zied par son équipement en voirie et en réseau de drainage des eaux pluviales et ce en vue d'améliorer les conditions de vie des habitants. Il comporte deux composantes à savoir :

- ✓ La voirie : Elle s'étend sur un linéaire total de 1 880 ml répartie entre 9 voies ;
- ✓ Le drainage des eaux pluviales : Le réseau de drainage des eaux pluviales se compose d'un linéaire de 900 ml répartie entre les voies du quartier.

État initial du site du projet

Le diagnostic réalisé dans le cadre de cette étude sur la situation actuelle a montré que le quartier, qui s'étend sur une surface de 6 hectares, comporte environ 210 logements et il compte un nombre total de 1050 habitants : Soit une densité de la population d'environ 175 habitants/ha.

Le quartier est desservi à 100% par le réseau eau potable de la SONEDE et il dispose d'un réseau communal d'eaux usées (ONAS).

Le quartier est également desservi en électricité à 100% et il est équipé en éclairage public. Toutes les voies du quartier ne sont pas revêtues et elles ne disposent pas de système de drainage. La présence de fortes pentes dans le quartier fait que les eaux pluviales se ruissellent ce qui explique la présence de points bas où les eaux stagnent pendant les pluies.

➤ Hydrologie et hydrogéologie

Hydrologie : Le réseau hydrographique du gouvernorat de Manouba s'organise en Trois bassins versants dont le plus marqué est celui de la basse vallée de la Medjerda. La délégation d'El Mornaguia est située à la basse vallée de la Medjerda.

Au niveau de la zone d'étude, on remarque qu'aucun cours d'eau ou oued ne la traverse.

Hydrogéologie : Le bassin de la basse vallée de la Medjerda est le principal aquifère du gouvernorat. La nappe est ainsi, alimentée essentiellement par l'oued Medjerda et oued Chafrou.

On note que la zone d'étude est affectée par le phénomène de la remontée de la nappe phréatique qui est à 1m du sol.

➤ Climatologie

Le climat dans la délégation d'El Mornaguia est méditerranéen appartenant à l'étage bioclimatique semi-aride supérieur, avec des hivers doux et humides et des étés secs et chauds. La température annuelle moyenne est de 17,7°C avec la minimale étant de 10°C et la maximale est de 26°C. La moyenne pluviométrique annuelle est de 454 mm.

➤ Faune et flore

Le quartier d'étude est une zone urbaine donc on ne trouve pas beaucoup de variétés de faune et de flore.

➤ Socio-économiques

Les activités économiques dans le quartier Tarek Ibn Zied sont peu développées.

Impacts de la phase des travaux

L'analyse des impacts de la phase des travaux sur l'environnement est résumée ci-après :

Impacts négatifs

- ✓ Impacts sur le milieu physique
 - Impacts sur la qualité de l'air
 - Gaz d'échappement des engins et des camions
 - Emission de poussières
 - Impacts sur la qualité du sol
 - Pollution du sol
 - Erosion du sol
 - Impacts sur les ressources en eaux
 - Contamination des eaux pluviales
 - Contamination de la nappe souterraine par déversement d'eau polluée ou fuites d'hydrocarbures
 - Impacts sur le paysage
 - Modification de la structure paysagère
- ✓ Impacts sur le milieu biologique
 - Impacts sur la faune et la flore

- Destruction des habitats de la faune lors des travaux d'enfouissement de la pose de conduite de réseau de drainage
- ✓ Impacts sur le milieu socio-économique
 - Impacts sur la sécurité routière
 - Perturbation de la circulation routière
 - Destruction des accès riverains
 - Impacts sur les infrastructures et constructions
 - Menaces et dégâts de certaines infrastructures et constructions existantes
 - Impacts sur la santé et la sécurité publique
 - Nuisances sonores et vibrations
 - Emissions de poussières
 - Accidentes de travail
 - Impacts sur l'agriculture
 - Atteintes des cultures lors des travaux d'enfouissement de la pose de conduite de réseau de drainage
 - Impacts sur les sites archéologiques
 - Pas d'impacts sur les patrimoines archéologiques

Impacts positifs

- ✓ Impacts sur le milieu socio-économique
 - Impacts sur la population
 - Postes d'emplois directs et indirects dans la zone du projet

Impacts de la phase d'exploitation

L'analyse des impacts de la phase d'exploitation sur l'environnement est résumée ci-après :

Impacts négatifs

- ✓ Impacts sur le milieu socio-économique
 - Impacts sur la sécurité routière
 - Augmentation des risques d'accidents routiers

Impacts positifs

- ✓ Impacts sur le milieu physique
 - Impacts sur la qualité de l'air
 - Absence d'émissions atmosphériques

- Réduction des poussières émises
- Impacts sur le paysage
 - Amélioration de la qualité esthétique du paysage global de la zone
- ✓ Impacts sur le milieu socio-économique
 - Impacts sur la santé et la sécurité publique
 - Meilleure gestion de la collecte des ordures ménagères
 - Meilleure gestion des procédures d'entretien des voiries et des divers équipements
 - Amélioration du drainage des voiries par l'aménagement de pentes adéquates et rehaussement des points bas
 - Impacts sur la sécurité routière
 - Faciliter l'accès vers le quartier et le rendre plus accessible
 - Améliorer le trafic routier
 - Permettre un approvisionnement plus aisé au quartier
 - Augmenter la fréquence de rotation des véhicules de collecte des ordures ménagères
 - Assurer une économie des dépenses de réparation et d'entretien des véhicules

Mesures de mitigation pour la phase des travaux

➤ Mesures prévues pour le milieu physique

- Arrosage des zones exposées au vent, zones de stockage des matériaux de construction et des déblais, des pistes ouvertes, itinéraires et des zones fréquentées par les camions,...
- Limitation de la vitesse de circulation des engins à 20 km/h dans le quartier et ses environs
- Aménager une zone de stockage provisoire des matériaux, déblais et évacuation quotidienne des déblais excédentaires vers la décharge contrôlée ou vers un site autorisé
- Entretien régulier des engins et des équipements du chantier
- Mise en place d'un plan de gestion des rejets hydrique et déchets solides
- Interdire le lavage des engins et véhicules sur le chantier
- Restaurer et nettoyer les sites de chantier en rétablissant le profil original de la topographie des sols

➤ Mesures prévues pour le milieu socio-économique

- Sensibiliser et informer à l'avance la population locale
- Mettre en place des dispositifs de sécurité et de signalisation routière
- Limiter la vitesse des engins sur le site
- Bonne organisation du chantier

- Réparation des dégâts au fur et à mesure de l'avancement des travaux
- Interdire l'arrachage des arbres fruitiers
- Suivre les voies d'accès au site d'action (entre les bordures nues des parcelles)
- Limiter les heures d'expositions des travailleurs aux bruits ;

Mesure de mitigation pour la phase d'exploitation

- Mesures prévues pour le milieu physique
 - Pas de mesures spécifiques à prendre
- Mesures prévues pour le milieu socio-économique
 - Limiter les vitesses des véhicules à l'intérieur de quartier
 - Installer des panneaux de signalisation routière à l'intérieur de quartier

Mise en place d'un plan de gestion environnemental et sociale (PGES)

Les estimations des dépenses correspondantes à la mise en place d'un PGES sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 1-1: Coût de la mise en place d'un PGES

Action	Coût (DT)
Atténuation	3 000
Suivi	5 500
Renforcement des capacités	5 000
TOTAL	13 500

Table des matières

1.	INTRODUCTION	12
2.	CADRE REGLEMENTAIRE	13
3.	PRESENTATION DE L'ARRU ET LE BUREAU D'ETUDE	17
3.1	Présentation de l'ARRU	17
3.2	Présentation du bureau d'étude I2E	18
4.	PERIMETRE SPATIAL ET TEMPOREL DU PROJET	19
4.1	Périmètre spatial.....	19
4.2	Périmètre temporel.....	20
5.	DESCRIPTION DU PROJET	21
5.1	Composantes du projet	21
5.2	Consistance du projet.....	21
5.2.1	Aménagement des voiries.....	21
5.2.2	Drainage des eaux pluviales.....	24
5.3	Quantité des travaux	27
6.	DESCRIPTION DE L'ETAT INITIALE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT.....	28
6.1	Situation administrative et géographique.....	28
6.2	Climatologie	29
6.3	Hydrologie/Hydrogéologie	30
6.4	Situation socio-économique du quartier Tarek Ibn Zied.....	31
6.4.1	Population.....	31
6.4.2	Ressources.....	32
6.5	Les équipements de base du quartier	32
6.5.1	Eau potable.....	32

6.5.2	Assainissement	32
6.5.3	Eau pluviale	32
6.5.4	Infrastructures d'énergie et de télécommunication.....	33
6.5.5	Réseau routier.....	34
6.5.6	Voirie	34
6.5.7	Trottoirs	34
7.	ANALYSE ET EVALUATION DES IMPACTS	36
7.1	Méthodologie d'évaluation des impacts	36
7.2	Impact de la phase des travaux.....	39
7.2.1	Impacts négatifs	39
7.2.2	Impacts positifs	43
7.3	Impact de la phase d'exploitation.....	43
7.3.1	Impacts négatifs	43
7.3.2	Impacts positifs	43
8.	MESURE DE MITIGATION	45
8.1	Mesure pour la phase des travaux.....	45
8.1.1	Mesures prévues pour le milieu physique.....	45
8.1.2	Mesures prévues pour le milieu biologique.....	48
8.1.3	Mesures prévues pour le milieu socio-économique.....	48
8.2	Mesure pour la phase d'exploitation.....	50
8.2.1	Mesures prévues pour le milieu physique.....	50
8.2.2	Mesures prévues pour le milieu socio-économique.....	50
9.	PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL.....	52
9.1	Plan d'atténuation durant le projet	53
9.2	Plan de surveillance et suivi Environnemental.....	63

9.3	Renforcement des capacités et formation.....	66
10.	CONSULTATION PUBLIQUE.....	67
11.	ANNEXE	68

LISTES DES FIGURES

Figure 4-1: Situation de la ville d'El Mornaguia.....	19
Figure 4-2: Vu aérienne du quartier Tarek Ibn Zied.....	20
Figure 5-1: Travaux projetés dans le quartier Tarek Ibn Zied	21
Figure 5-2: Voirie en terre non améliorée	23
Figure 5-3: Voirie en bicouche dégradé.....	23
Figure 5-4: Plan masse de la voirie projetée dans le quartier Tarek Ibn Zied Erreur ! Signet non défini.	
Figure 5-5: Plan masse du réseau de drainage projeté dans le quartier Tarek Ibn Zied ...	26
Figure 6-1: Position géographique du quartier Tarek Ibn Zied dans la commune d'El Mornaguia.....	29
Figure 6-2: Qualité du bâti.....	31
Figure 6-3: Stagnation des eaux pluviales et de la boue dans le quartier Tarek Ibn Zied.	33
Figure 6-4: Présence d'infrastructures d'énergie dans le quartier Tarek Ibn Zied.....	33
Figure 6-5: État actuel de la voirie dans le quartier Tarek Ibn Zied.....	34
Figure 6-6: État actuel des bordures des pistes dans le quartier Tarek Ibn Zied.....	35
Figure 7-1 : Grille de détermination de la signification de l'impact.....	37
Figure 7-2: Réseau de drainage de l'eau pluviale projetée	42

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1-1: Coût de la mise en place d'un PGES	6
Tableau 5-1: Récapitulatif des travaux projetés pour la réhabilitation du quartier Tarek Ibn Zied	27
Tableau 9-1: Plan d'atténuation	54
Tableau 9-2: Plan de suivi environnemental.....	64
Tableau 9-3: Programme de renforcement des capacités	66
Tableau 9-4: Coût de la mise en place d'un PGES.....	66

1. INTRODUCTION

Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et d'habitat des populations des quartiers populaires, l'ARRU a été chargée par les communes comme maître d'ouvrage délégué pour les projets indiqués dans les TDR rentrant dans le cadre du Programme de Réhabilitation des Quartiers Populaires pour la Réduction des Disparités Régionales et dont le financement est assuré par la Banque Mondiale dans le cadre du Programme de Développement Urbain et de la Gouvernance Locale (PDUGL).

Ces projets visent l'amélioration des conditions de vie dans ces quartiers par l'aménagement des infrastructures.

Ce document constitue le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet de réhabilitation du quartier Tarek Ibn Zied.

Le projet consiste à réhabiliter le quartier Tarek Ibn Zied par son équipement en voirie et en réseau de drainage des eaux pluviales et ce en vue d'améliorer les conditions de vie des habitants.

Dans ce dossier seront étudiées les différentes composantes du projet, avec dans tous les cas, une analyse de conformité avec les règles générales de protection de l'environnement et les normes.

Chapitre 2 : comporte le cadre réglementaire du projet ;

Chapitre 3 : Ce chapitre présente d'une manière succincte l'ARRU et le bureau d'études I2E chargé de l'élaboration de présent PGES ;

Chapitre 4 : Ce chapitre décrit le périmètre spatial et temporel du projet ;

Chapitre 5 : Ce chapitre est consacré à la description détaillée des différentes composantes du projet ;

Chapitre 6 : Ce chapitre décrit l'état initial de l'environnement de la zone du projet ;

Chapitre 7 : Ce chapitre est consacré à une présentation des impacts potentiels du projet sur l'environnement ;

Chapitre 8 : Dans ce chapitre, nous avons présenté les mesures d'atténuation prévues pour éviter d'éventuels impacts négatifs.

Chapitre 9 : Dans ce chapitre, nous avons élaboré un plan de gestion environnemental comportant, notamment, un plan de suivi environnemental à adopter durant les deux phases du projet (travaux et exploitation).

2. CADRE REGLEMENTAIRE

La Tunisie à travers le Ministère de l'Environnement a formulé une politique environnementale qui est basée sur la réconciliation de ses besoins de développement économique et social avec les impératifs environnementaux. Le pays s'est engagé à maintenir l'équilibre écologique, contrôler toutes les formes de pollution, sauvegarder les ressources naturelles (sol, eau, air, flore et faune) pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Tous ces objectifs sont repris dans la stratégie nationale pour le développement durable, conforme aux principes de la conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement (tenue à Rio en 1992). Pour atteindre tous ces objectifs, la Tunisie a créé une législation environnementale qui concerne plusieurs domaines (déchets, eau, air, etc.)

Évaluation Environnementale et Sociale

- Loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE), telle que modifiée et complétée par la Loi n° 92-115 du 30 novembre 1992, la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et la Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001. Selon les termes de l'article 8 de cette loi, les opérateurs qui endommagent l'environnement ou dont l'activité cause une pollution de l'environnement par des rejets solides, liquides, gazeux ou autres sont tenus à l'élimination, à la réduction et éventuellement à la récupération des matières rejetées ainsi qu'à la réparation des dommages qui en résultent. L'ANPE est habilitée à intenter, devant les tribunaux, toute action visant à obtenir la réparation des atteintes aux intérêts collectifs qu'elle a pour mission de défendre.
- Loi n°14-2001 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère chargé de l'environnement.
- Décret n°362-91 du 31 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement
- Décret n°1991 du 11 juillet 2005, portant la nécessité de la réalisation d'une étude d'impact environnementale comprenant un Plan de Gestion Environnemental (PGE) et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges.
- Arrêté du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable du 8 mars 2006, portant approbation des cahiers des charges relatives aux procédures environnementales

que le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire doit respecter pour les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges.

Déchets solides et dangereux

- Loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée par la Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001. Les déchets sont classés selon leur origine en déchets ménagers et déchets industriels et selon leurs caractéristiques en déchets dangereux, déchets non dangereux et déchets inertes. Le mode de gestion des déchets dangereux est réglementé. La liste des déchets dangereux est fixée par le Décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000. Les déchets ou boues de forage contenant des hydrocarbures, des sels de baryum, des chlorures, des métaux lourds ou des polymères sont des déchets dangereux.

La stratégie nationale tunisienne pour la gestion des déchets industriels et dangereux comporte les éléments suivants :

- Établissement de la liste des déchets dangereux selon leurs spécifications et origines ;
- Stockage et transport des déchets dangereux selon leurs caractéristiques et dangers ;
- Création d'un centre de traitement des déchets dangereux pour tout le Territoire Tunisien ;
- Création de trois centres de transfert régionaux ;
- Exportation de quelques déchets dangereux à l'étranger en se référant aux conventions internationales vu que leur traitement en Tunisie ne présente pas de rentabilité économique ;
- Encouragement à l'investissement pour la minimisation des déchets dangereux dans les circuits de production et développement des technologies propres.

Le chapitre V de la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 traite les dispositions spécifiques aux déchets dangereux dont les principaux articles sont décrits dans les paragraphes suivants.

- Décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux « Sont considérés comme déchets dangereux :
 - Les déchets figurant à l'annexe I du présent décret ;
 - Tout autre déchet qui contient l'un des constituants énumérés à l'annexe II et qui présente l'une des caractéristiques de danger mentionnées à l'annexe III du présent décret. ».

L'annexe I présente la liste des déchets dangereux classés selon leur nature ou l'activité qui les a produits, l'annexe II spécifie la liste des constituants qui confèrent aux déchets un caractère de danger et l'annexe III donne la liste des caractéristiques de danger.

- Loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses. Cette loi est composée de cinq chapitres (Chapitre I : des dispositions générales, Art. 1-3 ; Chapitre II : Des conditions de transport des matières dangereuses, Art. 4-8 ; Chapitre III : Des règles relatives à la circulation des véhicules automobiles et à leurs remorques transportant des matières dangereuses, Art. 9-14 ; Chapitre IV : Des obligations incombant aux participants dans l'opération de transport des matières dangereuses, Art. 15-22 ; Chapitre V : Des infractions et des peines, Art. 23-28). Quelques aspects importants sont décrits ci-dessous.
- L'arrêté du 19 janvier 2000 fixe les étiquettes de danger et les marques distinctives relatives au transport de matières dangereuses.
- Un des objectifs de base de la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 est la valorisation des déchets par la réutilisation, le recyclage et toutes autres actions visant la récupération des matériaux réutilisables et leur utilisation comme source d'énergie. Spécifiquement, les articles 29 et 30 abordent cette question.

Rejets sonores

- Décret n° 84-1556 du 29 décembre 1984, portant réglementation des lotissements industriels. Aux termes de l'article 26 de ce décret, le niveau de bruit de jour généré par une entreprise ne devra pas dépasser 50 décibels, mesurés au droit de la façade des habitations les plus proches de la zone d'activité

Rejets hydriques

Les textes suivants réglementent les rejets hydriques en Tunisie :

- Loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du Code des eaux. La pollution hydrique est réglementée particulièrement par les articles 107-139.
- Décret n° 85-56 du 2 janvier 1985, relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur. L'objectif principal est de fixer les conditions dans lesquelles sont réglementés ou interdits les rejets dans le milieu récepteur.

- Arrêté du ministère de l'économie nationale du 20 juillet 1989, portant homologation de la norme tunisienne relative aux rejets d'effluents dans le milieu hydrique.
- Norme tunisienne homologuée NT 106.02 (1989), Protection de l'environnement–Rejets d'effluents dans le milieu hydrique. L'objectif essentiel de cette norme est de définir les conditions auxquelles sont subordonnés les rejets d'effluents dans le milieu hydrique soumis à autorisation (cf. chapitre III du décret n° 85-56 du 2 janvier 1985). La norme spécifie les valeurs limites pour 54 paramètres.

Rejets atmosphériques

- Loi n° 2007-34 du 4 juin 2007, sur la qualité de l'air.
Cette loi est composée de cinq chapitres (Chapitre I : dispositions générales, Art. 1-2 ; Chapitre II: Des mesures de conservation de la qualité de l'air, Art. 3-5 ; Chapitre III : Des mesures de prévention de la pollution de l'air de sources mobiles, Art. 6-8 ; Chapitre IV : Des mesures de prévention de la pollution de l'air de sources fixes, Art. 9-11 ; Chapitre V : De la constatation des infractions, sanctions et transaction, Art. 12-15).
- Décret n° 2010-2519 du 28 septembre 2010, fixant les valeurs limites à la source des polluants de l'air de sources fixes. Le décret est constitué de trois chapitres (Chapitre I : dispositions générales, Art. 1-5 ; Chapitre II : Valeurs limite à la source des polluants de l'air, Art. 6-15 ; Chapitre III : Conditions et contrôle des émissions, Art. 16-21

3. PRESENTATION DE L'ARRU ET LE BUREAU D'ETUDE

3.1 Présentation de l'ARRU

L'ARRU est une entreprise publique à caractère industriel et commercial créée par la loi n°81-69 du 1er Août 1981.

Elle est chargée de l'exécution de la politique de l'Etat dans les domaines de la réhabilitation et de la rénovation urbaine, sous la tutelle du Ministère de l'Equipement, pour le compte de l'Etat et des collectivités publiques, principalement les communes.

L'intervention de l'ARRU s'effectue dans un cadre contractuel avec les collectivités publiques locales titulaires du projet qui se charge d'assurer le budget nécessaire au financement des projets.

L'ARRU a la charge de :

- L'identification des besoins nationaux dans le domaine de la réhabilitation et leur classification suivant les priorités.
- La proposition de programmes et de modes de financement.

L'intervention de l'ARRU peut avoir plusieurs formes, à savoir :

- a. Intervention en maîtrise d'ouvrage déléguée : Dans le cadre de son intervention par délégation de maîtrise d'ouvrage, l'ARRU se charge de toutes les étapes de réalisation du projet : apurement foncier, études préliminaires, techniques et financières des projets, signature des marchés, suivi des travaux, paiement des entreprises et des bureaux d'études et réception des travaux.
- b. Intervention en maîtrise d'ouvrage directe : Dans le cadre de son activité, l'ARRU réalise certains projets spéciaux comme les projets de promotion immobilière et ce, dans le but d'améliorer ses propres ressources et équilibrer ses comptes.
- c. Intervention en maîtrise d'ouvrage partagée : L'ARRU se charge de la réalisation de certains projets dans le cadre de partenariat avec les communes et ce, à travers la contribution partielle de la commune concernée au financement du projet ou à l'exécution de certaines composantes.

3.2 Présentation du bureau d'étude I2E

La société d'Ingénierie de l'Énergie et de l'Environnement I2E est un Bureau d'études tunisien, au capital de 164.000 DT appartient à EPPM société d'ingénierie et de réalisation dans le domaine de l'environnement.

Dans la réalisation des projets, I2E adopte une démarche globale qui s'applique à toute volonté :

- De développement de nouveaux axes stratégiques à partir d'un inventaire et d'un diagnostic de l'existant ;
- D'organisation et de mise en valeur des ressources et de l'espace et notamment les aménagements pour les activités économiques (voies routières, zones industrielles, espaces aménagés pour le tourisme.),

I2E (ex DHV Tunisie) intervient depuis plusieurs années dans le secteur de l'environnement en Tunisie. La qualité des travaux réalisés et des spécialistes qu'elle mobilise pour les études qui lui sont confiées en font un interlocuteur de plus en plus connu sur la place. I2E a capitalisé un savoir-faire dans les études de dépollution (hydrique, atmosphérique et solide). I2E a eu l'occasion d'élaborer de grands projets pluridisciplinaires d'envergure, pour plusieurs partenaires publics et privés (ANPE, DGRE, DGEQV, GCT, des pétroliers...) en Tunisie et à l'étranger, se rapportant au domaine de la protection de l'environnement. Parmi les principales études élaborées pour le compte du GCT, on peut citer :

- Contrat cadre pour l'élaboration des EIEs pour l'activité exploration pétrolière et gazière de SONATRACH (29 sites) en Algérie ;
- Caractérisation Environnementale et analyse (quantitative et qualitative) des déchets de forage des sites El Gassi, El Agreb et Zotti à Ouergla - Algérie ;
- EIES de la centrale thermique solaire à concentration de l'Akarit à Gabés ;

4. PERIMETRE SPATIAL ET TEMPOREL DU PROJET

4.1 Périmètre spatial

El Mornaguia est une ville située à quatorze kilomètres au sud-ouest de Tunis. Rattachée administrativement au gouvernorat de la Manouba, elle constitue une municipalité de 13 382 habitants. Chef-lieu d'une délégation de 35 129 habitants, elle est un centre agricole important pour la plaine du Mornaguia. Touchée par l'étalement urbain de l'agglomération tunisoise, elle fait partie des villes à forte croissance, d'autant plus qu'elle est située sur l'axe autoroutier Tunis-Medjez el-Bab.

Elle est délimitée par :

- Les gouvernorats de Tunis, Ben Arous à l'Est,
- le gouvernorat de Zaghouan au Sud,
- la délégation de Borj El Amri à l'Ouest,
- la délégation de Jedaïda au Nord.

La délégation regroupe les secteurs de Mornaguia, Bassatine, 20 Mars, Sidi Ali Hattab, Bou Ragba, Fejja et Hmaiem.



Figure 4-1: Situation de la ville d'El Mornaguia

La zone du projet, quartier Tarek Ibn Zied, est située au Sud de la Commune d'El Mornaguia, entouré par un lotissement en cours à droite et un autre quartier populaire à gauche.



Figure 4-2: Vu aérienne du quartier Tarek Ibn Zied

4.2 Périmètre temporel

Le démarrage des travaux est prévu au début de l'année 2017.

Les travaux vont être réalisés dans dix (10) mois.

5. DESCRIPTION DU PROJET

5.1 Composantes du projet

Le projet consiste à réhabiliter le quartier populaire Tarek Ibn Zied situé dans la commune d’El Mornaguia. Il comporte deux composantes à savoir :

- La voirie
- Les réseaux de drainage des eaux pluviales



Figure 5-1: Travaux projetés dans le quartier Tarek Ibn Zied

5.2 Consistance du projet

5.2.1 Aménagement des voiries

La voirie sera exécutée selon les normes d’usage en fonction des matériaux disponibles dans la région. L’intervention à ce niveau consiste à revêtir les voies en béton bitumineux 0/14 d’épaisseur 6cm avec un corps de chaussée constitué essentiellement par une couche de fondation de 15cm d’épaisseur et une couche de base de 15cm d’épaisseur.

La voirie sera exécutée dans la région et dans la limite de l’enveloppe allouée au projet et s’étend sur un linéaire total de 1880ml répartie entre 9 voies comme suit :

N° Voie	Long (m)	Larg. M-M (m)	Larg (m)	Etat existant	Aménagement projeté
V1	531	9,00	5,00	Voie revêtue en bicouche extrêmement dégradé.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terrassement, ✓ Couche de fondation en grave concassé 0/31,5 d'épaisseur 15cm, ✓ Couche de base en grave concassé 0/20 d'épaisseur 15cm, ✓ Bordures T2 et Caniveaux latéraux CS2, ✓ Revêtement en béton bitumineux 0/14 d'épaisseur 6cm, ✓ Revêtement des trottoirs en autobloquant.
V2	398	8,50	5,00	Voie revêtue en bicouche extrêmement dégradé.	
V3	161	7,80	5,00	Voie revêtue en bicouche extrêmement dégradé.	
V4	147	7,80	5,00	Voie revêtue en bicouche extrêmement dégradé.	
V5	129	8,00	5,00	Voie revêtue en bicouche extrêmement dégradé.	
V6	89	9,00	5,00	Voie revêtue en bicouche extrêmement dégradé.	
V7	61	7,20	5,00	Voie revêtue en bicouche extrêmement dégradé.	
V8	121	8,00	5,00	Voie revêtue en terre non améliorée.	
V9	59	4,00	4,00	Voie revêtue en terre non améliorée.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terrassement, ✓ Couche de fondation en grave concassé 0/31,5 d'épaisseur 20cm, ✓ Revêtement en chape d'épaisseur 12cm.



Figure 5-2: Voirie en terre non améliorée

V3 (36°45'21.15"N/ 10° 0'52.73"E)



Figure 5-3: Voirie en bicouche dégradé

V4 (36°45'19.80"N/ 10° 0'53.54"E)

Il faudra procéder à une mise à niveau par rehaussement ou abaissement des regards de visite et des boîtes de branchement rencontrés dans les voies à aménager (voir Figure 5-4).

5.2.2 Drainage des eaux pluviales

Une quantité importante d'eau pluviale est reçue au niveau de la fin de la voie V1, ce qui nécessite la projection d'un réseau d'eau pluviale qui rejette vers le réseau existant (voir Figure 5-5).

Le réseau de drainage des eaux pluviales sera réparti comme suit :

- Environ 1392 ml de conduite de diamètre Ø600
- Environ 112 ml de conduite de diamètre Ø315
- 44 regards de diamètre Ø1000
- 31 regards à grille

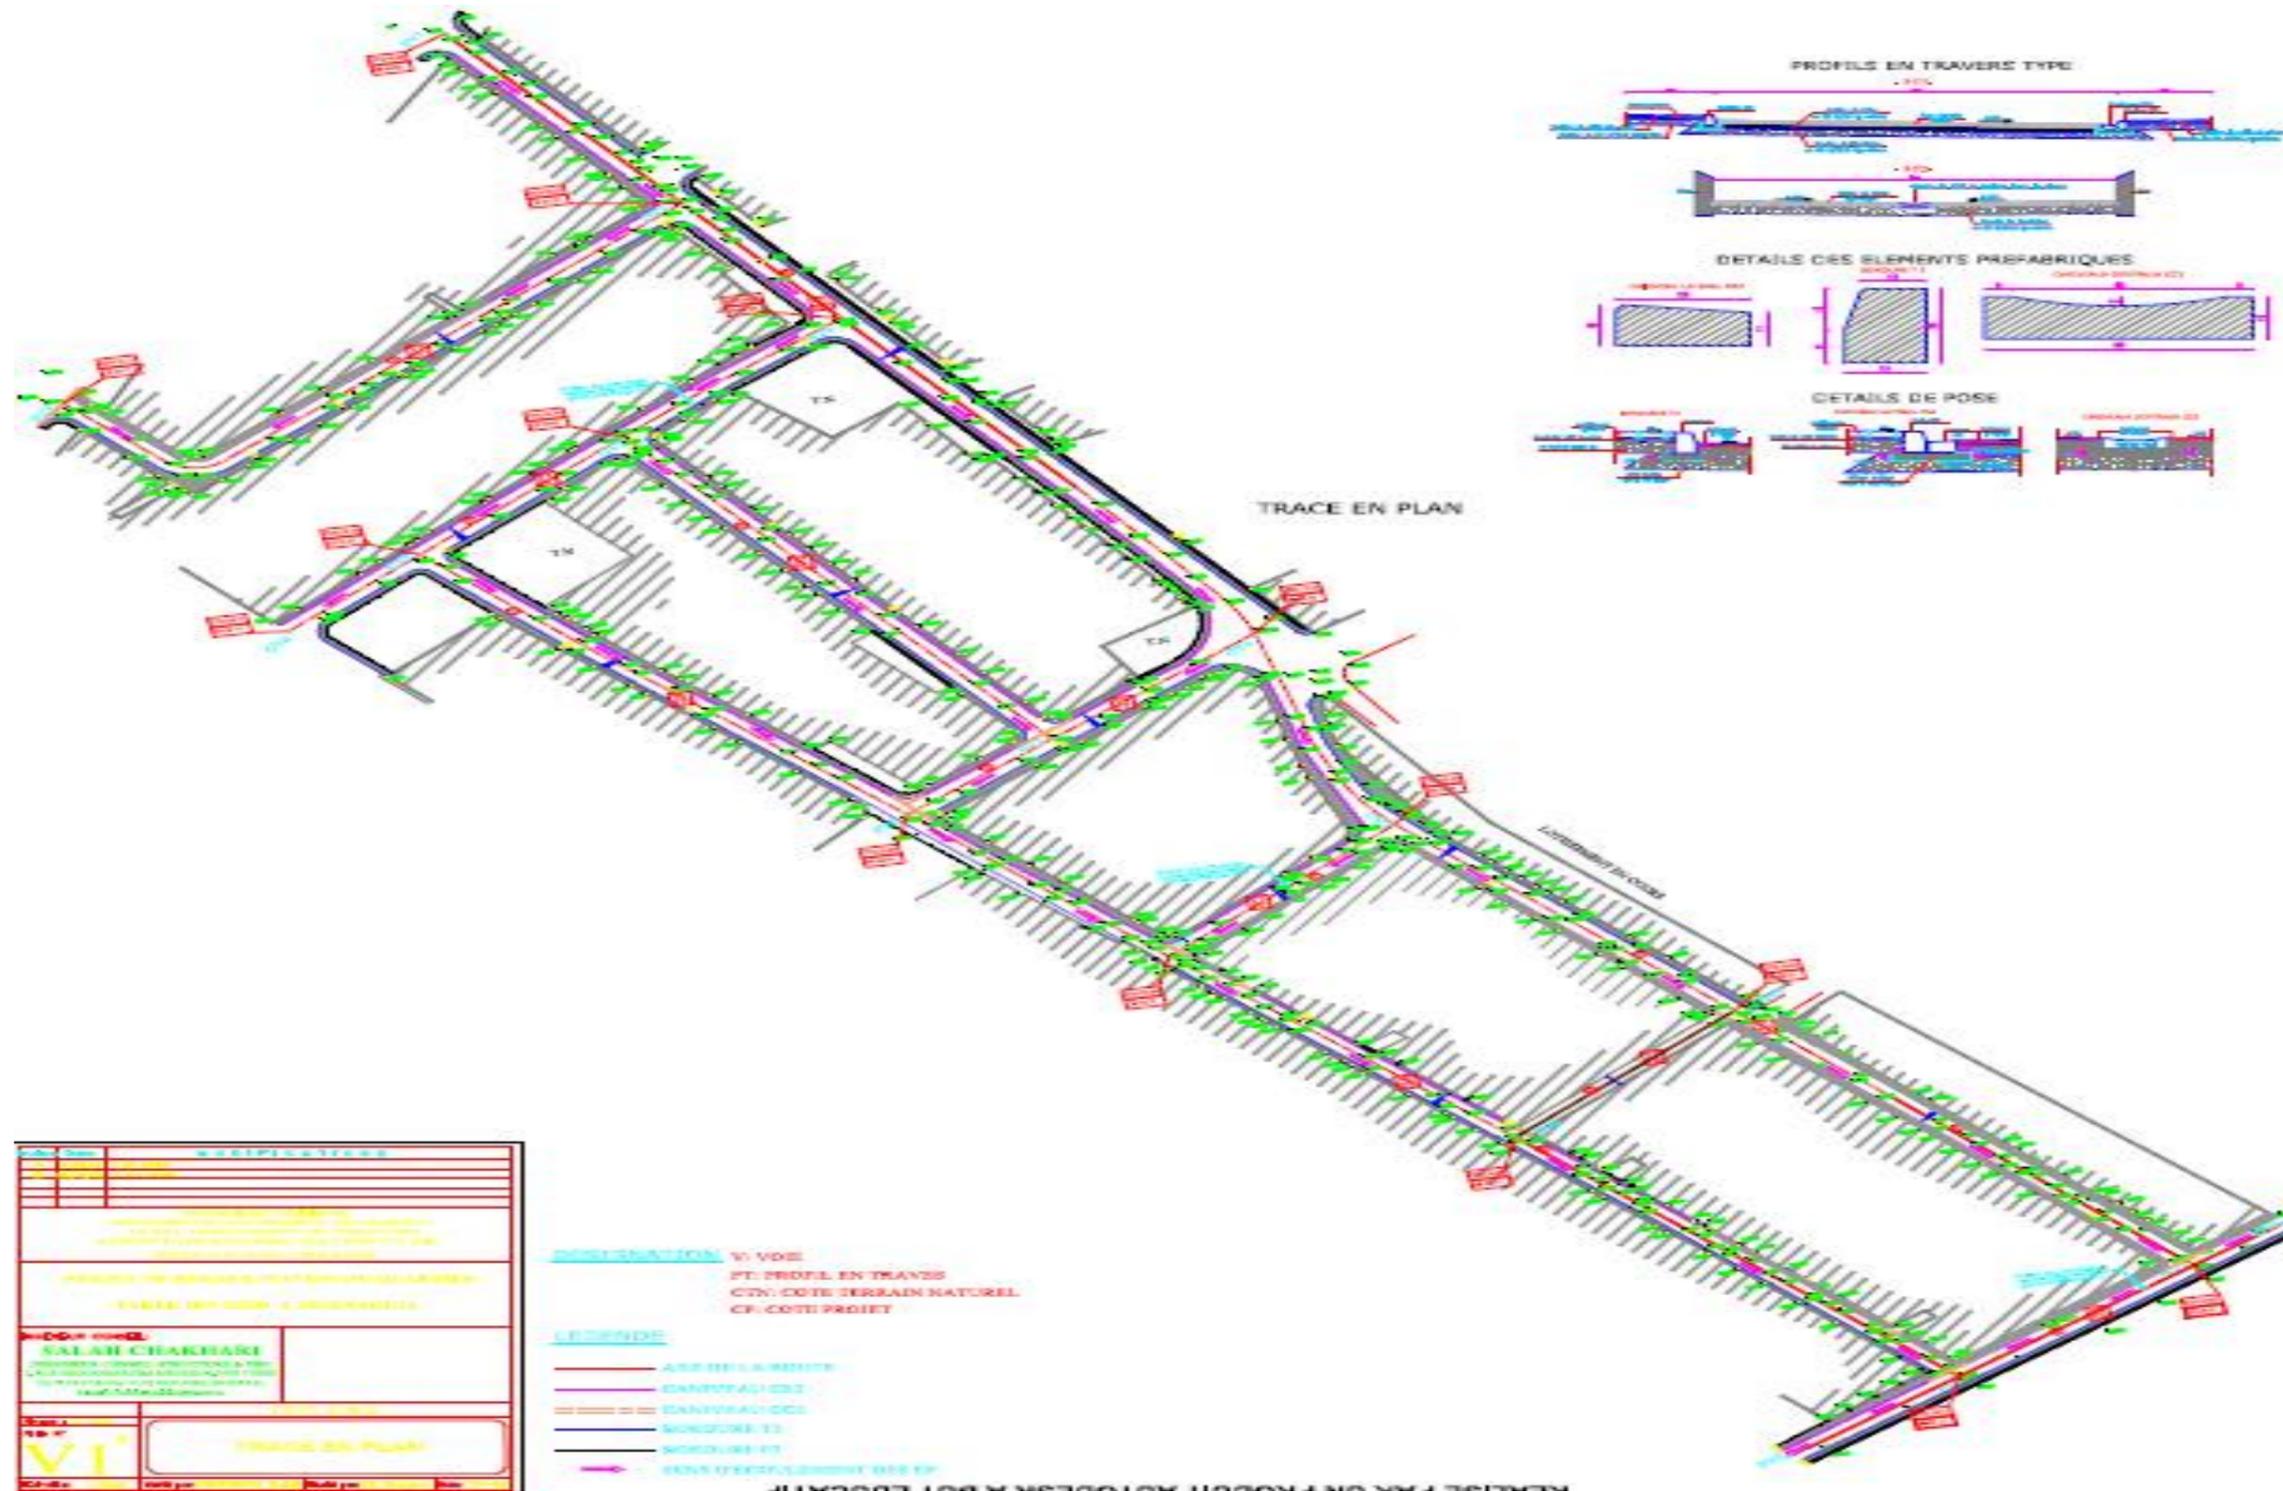


Figure 5-4: Plan massé de la voirie projetée dans le quartier Tarek Ibn Zied

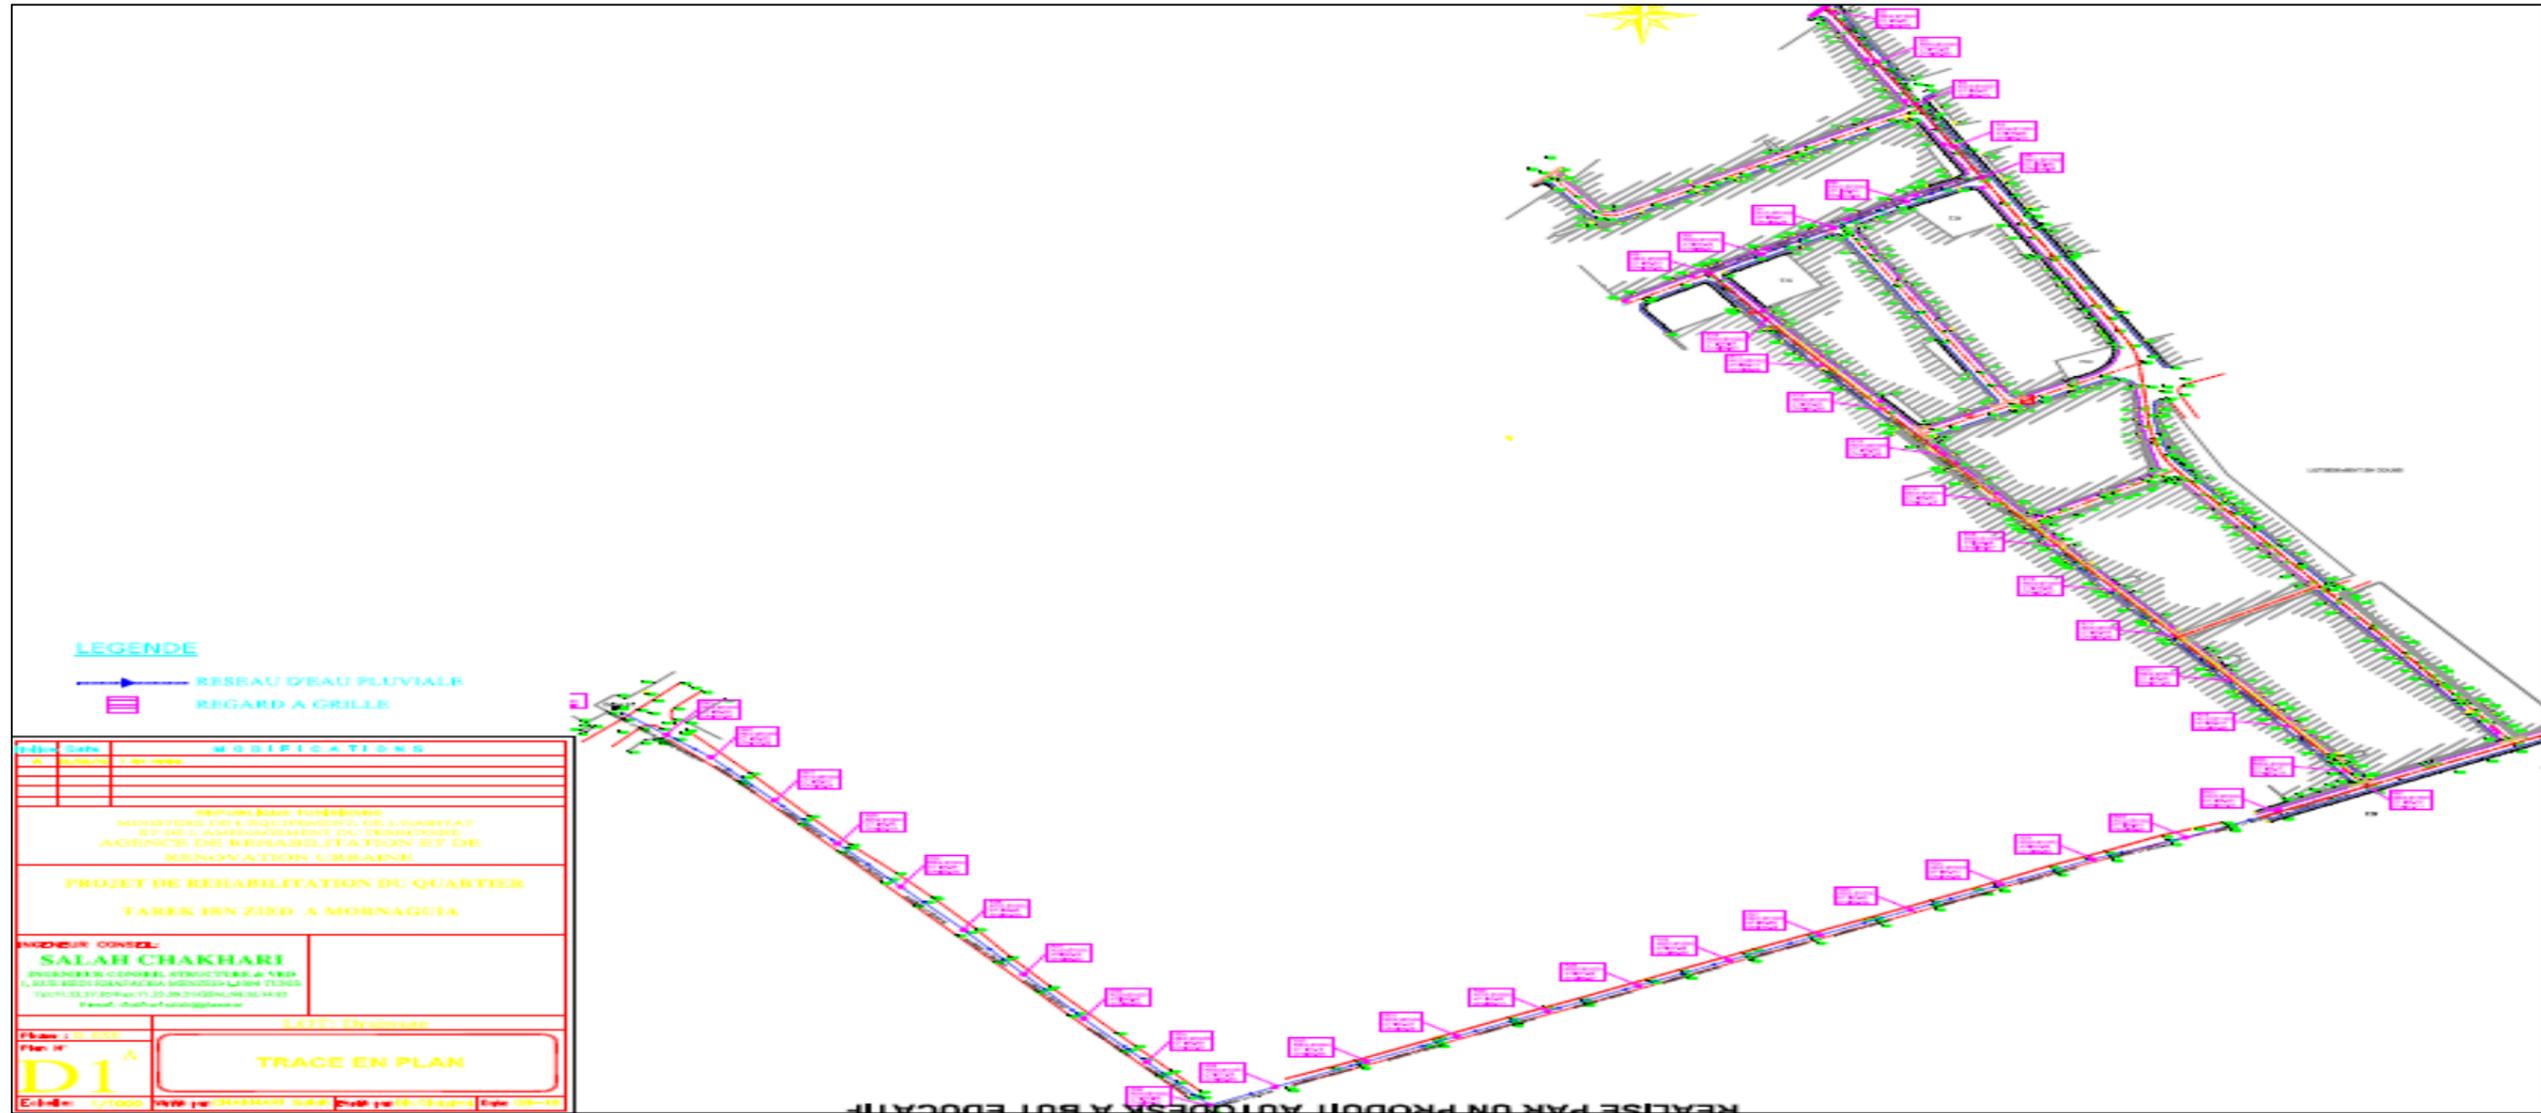


Figure 5-5: Plan masse du réseau de drainage projeté dans le quartier Tarek Ibn Zied

5.3 Quantité des travaux

Le tableau ci-dessous récapitule les quantités des matériaux manipulés dans le cadre du projet d'aménagement et de réhabilitation du quartier Tarek Ibn Zied :

Tableau 5-1: Récapitulatif des travaux projetés pour la réhabilitation du quartier Tarek Ibn Zied

	Matériaux utilisés	Quantité	Unité
Travaux d'aménagement de la voirie	Terra	3621	m ³
	Construction de Fondation	1509	m ³
	Construction de Base	1228	m ³
	Bordures P2	802	ml
	Bordures T2	3274	ml
	CS2	1637	ml
	CC2	110	ml
	Autobloquant	5620	m ²
	Chape armée	605	m ²
Travaux d'aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales	Revêtement en enrobée	8421	m ²
	Regard Ø1000	44	U
	Conduite Ø600	1392	ml
	Conduite Ø315	112	ml
	Regard à grille	31	U

6. DESCRIPTION DE L'ETAT INITIALE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

La description de l'état actuel de l'environnement naturel et social du site du projet a pour objectifs l'identification et la description des éléments environnementaux susceptibles de subir les impacts potentiels du projet durant la phase travaux et la phase exploitation. Les informations fournies dans ce chapitre sont basées, d'une part, sur une campagne d'exploration du site accompagnée d'une enquête sur les lieux et, d'autre part, sur les documents de l'avant-projet.

6.1 Situation administrative et géographique

Administrativement, le quartier Tarek Ibn Zied est rattaché à la délégation d'El Mornaguia du gouvernorat de Manouba. Il est parmi les quartiers récents de la ville d'El Mornaguia, qui a pris naissance depuis les années quatre-vingt et il est classé comme un quartier purement résidentiel.

Le quartier Tarek Ibn Zied est situé au Sud de la Commune d'El Mornaguia, entouré par un

Le quartier Tarek Ibn Zied est identifié comme suit :

Surface totale	6 ha
Surface urbanisée	6 ha
Nombre de logements	210 logements
Densité nette	35 logements/ha
Nombre de ménages	210 ménages
Nombre des habitants	1050 habitants
Qualité du bâti	Moyenne
Type de logement	isolé – jumelé - bande
Quartier couvert par le PAC	Oui
Quartier couvert par le PAD	Non

Ce quartier est délimité :

- Du côté Nord par une route et des zones habitées ;
- Du côté Est par des zones habitées et des terres agricoles ;
- Du côté Sud par des terrains agricoles ;
- Du côté Ouest par des terrains agricoles.



Figure 6-1: Position géographique du quartier Tarek Ibn Zied dans la commune d'El Mornaguia

6.2 Climatologie

Le climat dans la délégation d'El Mornaguia est méditerranéen appartenant à l'étage bioclimatique semi-aride supérieur, avec des hivers doux et humides et des étés secs et chauds. La température annuelle moyenne est de 17,7°C avec la minimale étant de 10°C et la maximale est de 26°C. La moyenne pluviométrique annuelle est de 454 mm.

Des précipitations moyennes de 3 mm font du mois de Juillet le mois le plus sec.

Avec une moyenne de 65 mm, c'est le mois de Janvier qui enregistre le plus haut taux de précipitations.

La répartition de la pluviométrie dans la zone se caractérise par :

- Une période pluvieuse automnale qui cumule environ 36% de la pluie annuelle. Ces pluies sont souvent sous la forme d'orages à fortes intensités.
- Une période hivernale pluvieuse qui cumule environ 37% de la pluie annuelle.
- Une période printanière à pluviométrie modérée, qui cumule environ 21% de la pluie annuelle.
- Une période estivale sèche d'une durée de trois mois (Juin, juillet et Août) qui cumule moins de 5% de la pluie annuelle.

Au niveau de la délégation d'El Mornaguia, il existe deux saisons thermiques :

- Une saison chaude, qui s'étend du mois de Mai jusqu'au mois d'Octobre. Les maximas annuels absolus ont lieu en mois d'Août qui est le mois le plus chaud de l'année avec une température de 26.0°C.
- Une saison froide, qui s'étend sur le reste de l'année dont les minimas annuels absolus ont lieu en mois de Janvier qui est le mois le plus froid de l'année avec une température de 10.1°C.

En examinant la moyenne des maximas du mois le plus chaud (Août 26,0 °C) et la moyenne des minimas du mois le plus froid (Janvier 10,1 °C) on constate que l'amplitude thermique moyenne annuelle est de l'ordre de 15,9 °C. Les vents les plus fréquents soufflent des secteurs septentrionaux surtout de l'Ouest au Nord-Ouest et responsables des précipitations, fréquentes pendant la période hivernale. De même les vents qui soufflent du Sud Est au Sud ne sont pas négligeables et peuvent devenir importants et actifs surtout au printemps et en été. Ces vents sont responsables des fortes élévations de températures pendant la période estivale.

6.3 Hydrologie/Hydrogéologie

Hydrologie : Le réseau hydrographique du gouvernorat de Manouba s'organise en Trois bassins versants dont le plus marqué est celui de la basse vallée de la Medjerda. La délégation d'El Mornaguia est située à la basse vallée de la Medjerda.

Au niveau de la zone d'étude, on remarque qu'aucun cours d'eau ou oued ne la traverse.

Hydrogéologie : Le bassin de la basse vallée de la Medjerda est le principal aquifère du gouvernorat. La nappe est ainsi, alimentée essentiellement par l'oued Medjerda et oued Chafrou. On note que la zone d'étude est affectée par le phénomène de la remontée de la nappe phréatique qui est à 1m du sol.

6.4 Situation socio-économique du quartier Tarek Ibn Zied

6.4.1 Population

Le nombre total d'habitants dans le quartier Tarek Ibn Zied de la commune d'El Mornaguia, de l'ordre de 1050 avec un nombre de logement d'environ 210. Le quartier couvre une superficie d'environ 6 ha. Soit une densité de la population d'environ 175 habitants/ha.

Si l'on estime à 35 129 le nombre total d'habitants de la commune d'El Mornaguia, le quartier Tarek Ibn Zied représenterait alors, environ 3% de la population totale d'El Mornaguia.

La topologie des logements rencontrés dans le quartier est de type social, groupé ou jumelé avec une moyenne de surface de l'ordre de 200 m² et une densité par hectare de l'ordre de 35log/Ha.

La qualité du bâti rencontrée sur les lieux est très modeste pour les logements achevés et en état de chantier pour les logements en extension ou en cours de construction.



Figure 6-2: Qualité du bâti

V2 (36°45'14.38"N/ 10° 0'52.63"E)

6.4.2 Ressources

La délégation d'El Mornaguia se caractérise par une production agricole importante surtout au niveau du maraîchage avec une quantité de 32 200 T/an et l'arboriculture avec 20 300 T/an.

Le taux d'investissement agricole par rapport aux autres délégations dans le gouvernorat de Manouba est de 11.7%

Elle possède également une importante zone industrielle qui s'étend sur 28.5Ha avec 25 entreprises et qui assure 1 573 emplois.

6.5 Les équipements de base du quartier

6.5.1 Eau potable

Actuellement, la délégation d'El Mornaguia est bien desservie par la SONEDE et le réseau d'alimentation est en bon état de fonctionnement. Le taux des abonnés domestiques au réseau est de l'ordre de 100%.

6.5.2 Assainissement

La ville d'El Mornaguia ainsi que toutes les voies à aménager sont dotées d'un réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux usées en bon état, conformes aux normes de l'ONAS. Ce réseau d'assainissement existant est un réseau communal, et il est pris en charge par l'ONAS. Ce réseau dessert presque tous les logements.

6.5.3 Eau pluviale

Le quartier Tarek Ibn Zied est dépourvu de tout système de drainage des eaux pluviales. Actuellement, vu l'existence d'une forte pente, les eaux pluviales se ruissellent correctement. Cependant, lors de la visite sur site, on a noté stagnation des eaux pluviales dans quelques endroits du quartier, comme la montre les figures suivantes, durant la période des pluies.



V2 (36°45'16.33"N/ 10° 0'51.09"E)



V2 (36°45'10.15"N/ 10° 0'56.13"E)

Figure 6-3: Stagnation des eaux pluviales et de la boue dans le quartier Tarek Ibn Zied

6.5.4 Infrastructures d'énergie et de télécommunication

Le réseau d'électricité dessert bien la totalité de la population de la Commune d'El Mornaguia ainsi que tous les citoyens des voies à aménager. En effet, les logements sont branchés, par un réseau aérien, à partir de lignes moyenne tension. Le taux d'électrification est de l'ordre de 100%.

Le quartier est également desservi par un réseau d'éclairage public aérien, la majorité des foyers sont implantés sur les poteaux d'alimentation de l'énergie électrique de la STEG.



Figure 6-4: Présence d'infrastructures d'énergie dans le quartier Tarek Ibn Zied

V2 (36°45'10.15"N/ 10° 0'56.13"E)

6.5.5 Réseau routier

La route nationale RN5 représente la seule desserte nationale de la Commune d'El Mornaguia qui relie Tunis à Mdjez el Bab.

6.5.6 Voirie

Le quartier est dépourvu de voie bitumée. Le quartier se situe sur un terrain plus ou moins plat avec de fortes pentes. Quelques logements ne s'alignent pas avec les tracés des voiries. Les emprises des voies s'étendent sur des largeurs entre 4 et 6 m.



V3 (36°45'21.15"N/ 10° 0'52.73"E)



V2 (36°45'14.38"N/ 10° 0'52.63"E)

Figure 6-5: État actuel de la voirie dans le quartier Tarek Ibn Zied

6.5.7 Trottoirs

Les autobloquants vont être installés dans toutes les voies (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8) sauf la voie V9. Les autobloquants s'étendent sur 5620 m². Le reste des logements ont construit des trottoirs en béton ou ciment par les propres moyens pour les besoins de protection contre l'entrée des eaux pluviales.



V2 (36°45'16.33"N/ 10° 0'51.09"E)



V3 (36°45'18.96"N/ 10° 0'48.40"E)



V1 (36°45'11.32"N/ 10° 0'58.27"E)

Figure 6-6: État actuel des bordures des pistes dans le quartier Tarek Ibn Zied

7. ANALYSE ET EVALUATION DES IMPACTS

Dans ce chapitre sont présentés les divers types d'impacts potentiels temporaires environnementaux et sociaux susceptibles de se produire durant la réhabilitation du quartier Tarek Ibn Zied. L'appréciation de ces impacts potentiels devrait nous aider à déterminer les mesures nécessaires pour les éviter ou les compenser.

7.1 Méthodologie d'évaluation des impacts

L'approche méthodologique repose d'abord sur l'appréciation de trois indicateurs, c'est-à-dire l'intensité (déterminée en fonction de la valeur de la composante et le degré de perturbation), l'étendue et la durée de l'impact appréhendé. Ces quatre indicateurs sont agrégés en un indicateur synthèse, soit la signification de l'impact potentiel anticipé. Dans une seconde étape d'analyse, l'importance de l'impact résiduel est estimée de manière à porter un jugement global sur l'impact associé à l'interaction d'une activité sur une composante environnementale, en considérant les mesures d'atténuation mises de l'avant pour réduire les effets néfastes anticipés.

La figure suivante montre le processus menant à l'évaluation de la signification des impacts environnementaux potentiels, puis à celle de l'importance des impacts environnementaux.

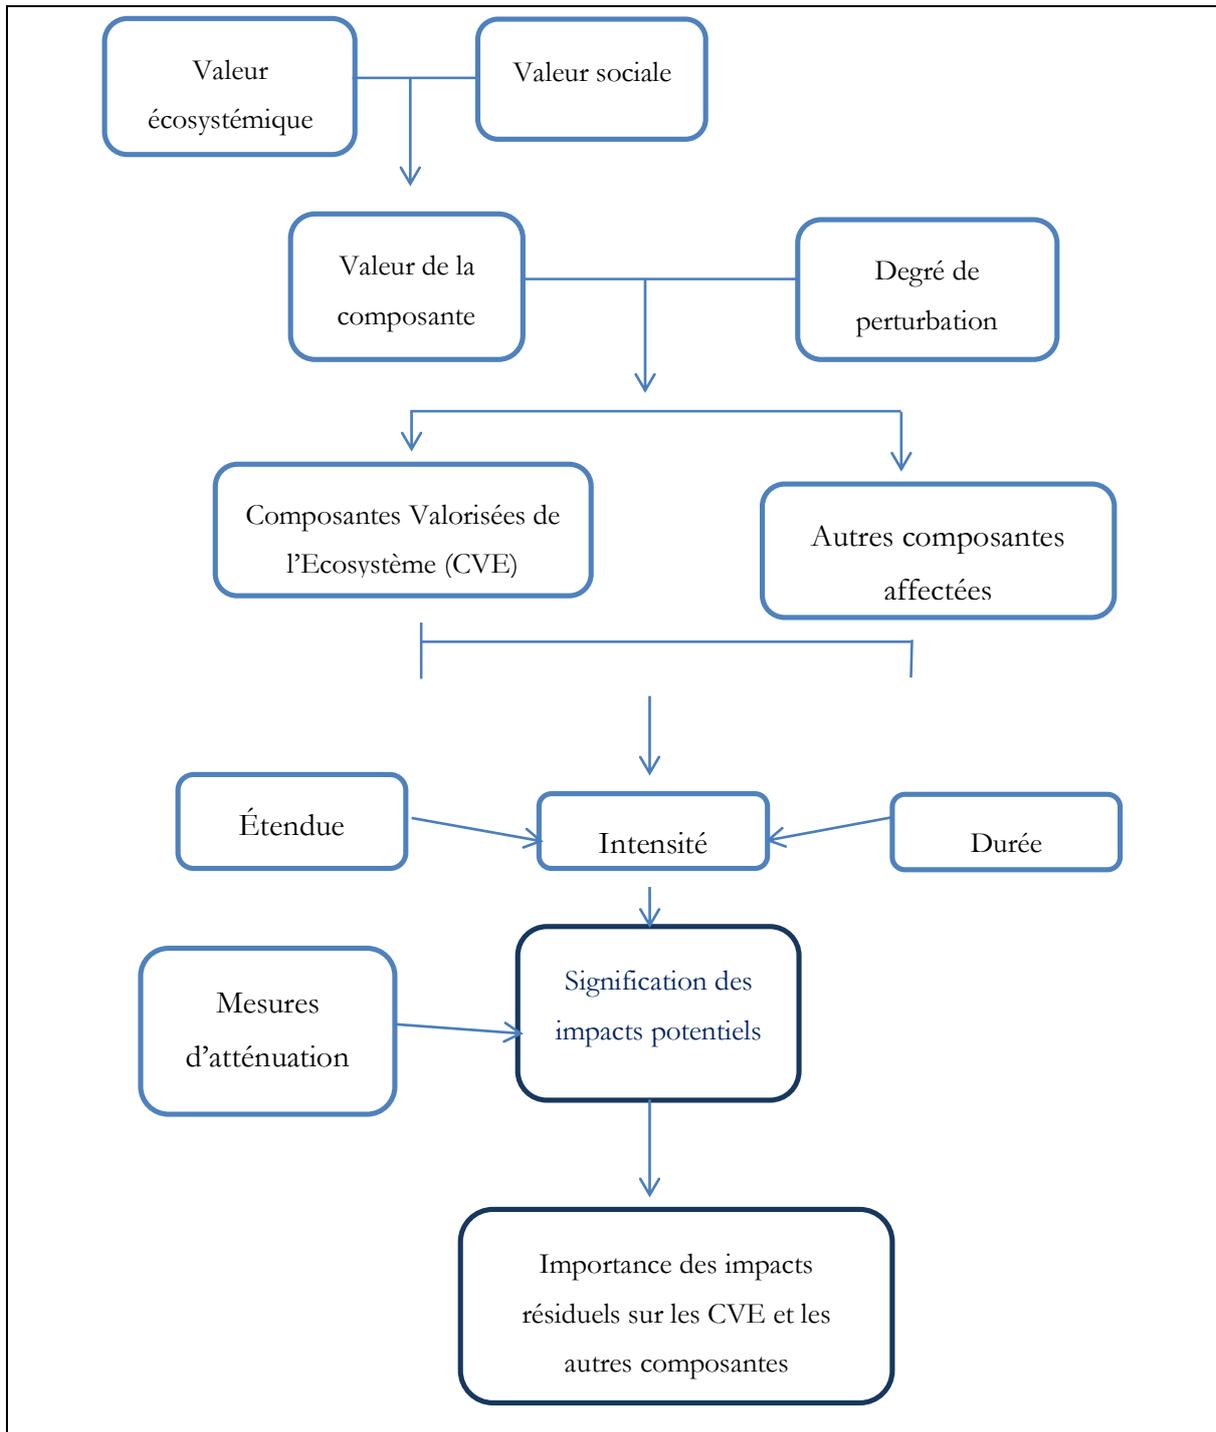


Figure 7-1 : Grille de détermination de la signification de l'impact

L'évaluation de la signification de l'impact potentiel repose sur l'intégration des trois indicateurs décrits précédemment, soit l'intensité, l'étendue et la durée de l'impact et est obtenue à l'aide de la grille présentée au tableau ci-dessous. Il est ainsi possible d'identifier trois niveaux de signification :

- ❖ Majeur : l'impact occasionne des répercussions fortes sur la composante touchée par le projet, correspondant à une altération profonde de sa nature et de son utilisation, et pouvant même mettre en cause sa pérennité.
- ❖ Moyen : l'impact occasionne des répercussions appréciables sur la composante touchée, entraînant une altération partielle de sa nature et de son utilisation, sans toutefois mettre en cause sa pérennité dans la zone d'étude.
- ❖ Mineur : l'impact occasionne des répercussions réduites sur la composante touchée, entraînant une altération mineure de sa qualité et de son utilisation.

Tableau 7-1: Grille d'évaluation de l'importance de l'impact

Intensité de l'impact	Étendue de l'impact	Durée de l'impact	Signification de l'impact potentiel
Forte	Régionale	Longue	Majeure
		Moyenne	Majeure
		Courte	Moyenne
	Locale	Longue	Majeure
		Moyenne	Majeure
		Courte	Moyenne
	Ponctuelle	Longue	Moyenne
		Moyenne	Moyenne
		Courte	Mineure
Moyenne	Régionale	Longue	Majeure
		Moyenne	Majeure
		Courte	Moyenne
	Locale	Longue	Majeure
		Moyenne	Moyenne
		Courte	Moyenne
	Ponctuelle	Longue	Moyenne
		Moyenne	Moyenne
		Courte	Mineure
Faible	Régionale	Longue	Moyenne
		Moyenne	Moyenne
		Courte	Mineure

Intensité de l'impact	Étendue de l'impact	Durée de l'impact	Signification de l'impact potentiel
	Locale	Longue	Moyenne
		Moyenne	Moyenne
		Courte	Mineure
	Ponctuelle	Longue	Mineure
		Moyenne	Mineure
		Courte	Mineure

Pour les deux phases de projet, les composantes qui seront prises en compte dans le projet sont les suivantes :

Phase du projet	Composante du projet
Pendant les travaux	Installation et préparation du site
	Terrassement et préparation des emprises
	Réalisation des travaux des voiries
	Réalisation des travaux du système de drainage des eaux de pluie
Pendant l'exploitation	Entretien de la Voirie, trottoirs et système drainage

7.2 Impact de la phase des travaux

Dans cette partie, nous présentons une évolution des impacts potentiels susceptibles de se manifester durant la phase des travaux du projet de réhabilitation de quartier Tarek Ibn Zied.

7.2.1 Impacts négatifs

7.2.1.1 Impacts potentiels sur le milieu physique

- **Qualité de l'air** : Pendant les travaux, la qualité de l'air sera localement et temporairement affectée, d'une part, par l'émission de la poussière causée par les déplacements des engins, des véhicules de chantier et des travaux de terrassements, des travaux d'aménagements des voiries et réseau de drainage et, d'autre part, par le dégagements des gaz d'échappements des engins et des camions de différentes catégories arrivant au site. Les impacts potentiels

de ces travaux de construction restent toujours sur une durée moyenne et peuvent être atténué par des moyens simples et efficaces. D'où l'importance de l'impact est jugée **moyenne**.

➤ **Qualité du sol** : Les travaux d'aménagements du quartier Tarek Ibn Zied peuvent engendrer des impacts négatifs sur le sol. En effet, la circulation des camions de transport des matériaux et des engins de pose, l'aménagement des pistes de travail et de voiries auront des impacts potentiels. Parmi ces impacts, on distingue :

- Risque de la pollution de sol par les déchets solides ou les rejets hydriques. Cependant ces effets temporaires dus au chantier sont très localisés dans l'espace et sont à courte durée, d'où l'importance de l'impact est jugée **moyenne**
- Risque d'érosion de sol, durant les travaux de terrassements, et surtout durant les travaux de pose de conduite du réseau de drainage, les sols nus seront exposés au phénomène d'érosion. En effet, l'ouverture des passages et des tranchées d'enfouissement dans les écoulements d'eau auront pour conséquence l'érosion des zones agricoles environnantes en cas de pluie forte. Compte tenu de la courte durée du chantier, l'importance de l'impact est jugée **moyenne** ;
- Risque de compactage de sol causé par les mouvements des engins au niveau des voies. Vu la nature du site (zone urbaine déjà aménagée) et la courte durée de la phase chantier, l'importance de l'impact est jugée **mineure**.

➤ **Ressource en eaux** :

- Pour les eaux superficielles : Le quartier Tarek Ibn Zied n'est pas traversé par un oued ou un cours d'eau superficiel. A cet effet, les travaux de chantier n'auront pas d'impacts sur le système hydrologique de surface de la zone d'études. Par contre les matériaux de terrassement accumulés provisoirement sur le chantier peuvent gêner le drainage superficiel des eaux pluviales. Aussi, des hydrocarbures, des lubrifiants propres ou usagés, et des produits bitumineux pourront contaminer les eaux pluviales. Ces impacts locaux et temporaires seront minimes. Donc l'importance de l'impact est jugée **moyenne**
- Pour les eaux souterraines : Compte tenu de la faible profondeur de la nappe phréatique de la zone d'étude, les travaux du chantier peuvent éventuellement affecter la nappe par déversement d'eau polluée ou par fuites d'huiles et d'hydrocarbures des engins de terrassement. Toutefois, et quel que soit la sensibilité de la nappe d'eau

souterraine gîtant au-dessous des aires de chantier, une bonne gestion des produits polluants en phase de chantier est nécessaire. Les effets des travaux de construction des différentes infrastructures sur les ressources en eau sont temporaires et très localisés dans l'espace et sont de courte durée. L'importance de l'impact est jugée **moyenne**.

- **Paysage** : L'impact visuel des installations de chantier, des ouvertures des voies, des déblais excédentaires ou de remblayage peut engendrer une modification temporaire du paysage. Cette modification de paysage ne serait ressentie que par la population locale du quartier Tarek Ibn Zied et ses environs. Donc, les effets des travaux de construction des différentes infrastructures sur le paysage sont temporaires et très localisés dans l'espace et sont de courte durée. D'où l'importance de l'impact est jugée **mineure**.

7.2.1.2 Impacts potentiels sur le milieu biologique

- **Faune et flores** : En phase des travaux, les impacts potentiels négatifs sur la faune et flore sont les risques de perturbation temporaire de la faune et de la flore due à l'activité intense au cours de la phase de construction. En effet, les travaux d'ouverture de la tranchée d'enfouissement pour la pose de la conduite du réseau de drainage s'accompagnent par une destruction d'un certain nombre de terriers d'animaux. Les mouvements des engins et le déplacement du personnel dans la zone du projet peuvent perturber temporairement la quiétude de la faune existante. Cette dernière est capable de trouver refuge dans les régions qui entourent le site de projet.

Etant donné la densité animale faible du site des travaux (réhabilitation des voiries dans une zone urbaine mais le passage de la conduite du réseau de drainage se fait à côté d'une terre agricole), l'intensité de l'impact serait alors faible. Donc, l'importance de l'impact est jugée **mineure**.

7.2.1.3 Impact sur le milieu socio-économique

- **Sécurité routière** : Pendant les travaux, la circulation sera perturbée par les mouvements des camions et engins de travaux d'une part, d'autre part par les travaux routiers proprement dit. Les travaux pourront conduire à la destruction temporaire des accès riverains ce qui augmente les difficultés de mobilités pour la population locale. Vu la durée courte du chantier, l'importance de l'impact sera jugée **moyenne**.

- **Infrastructures et constructions** : Pendant la phase des travaux, certaines infrastructures et constructions existantes (poteau électrique, réseau eau potables, réseau téléphonique et bordures des constructions) peuvent être soumise à des dégâts temporels dans les zones d’emprises des voiries et réseau de drainage si des précautions ne sont pas prises en compte. D’où l’importance de l’impact est jugée **moyenne**.
- **Sante et sécurité publique** : Les travaux peuvent générer des négatifs temporaires qui peuvent concerner en particulier :
 - Les nuisances sonores dues à la mobilisation et au fonctionnement des équipements du chantier et à la présence des engins de terrassements ;
 - Les vibrations dues aux matériels de travail ;
 - Les émissions de poussières liées aux travaux du chantier ;
 - Les accidents de travail liés aux vitesses des véhicules et engins de chantier ou encore aux pratiques dangereuses de certains chauffeurs durant les travaux, chutes, blessures, brûlures, etc.

D’où l’importance de l’impact est jugée **moyenne**

- **Agriculture** : Le quartier Tarek Ibn Zied est situé en plein zone urbaine dépourvue des terrains agricoles. Cependant, et afin de réaliser le raccordement du réseau avec le système existant d’évacuation des eaux pluviales, la pose de la conduite du réseau de drainage va traverser une piste existante dans une terre agricole privée.



Figure 7-2: Réseau de drainage de l’eau pluviale projetée

Vu que l'aménagement des pistes de pose de la conduite ne suivra que la piste existante et les travaux du chantier auront une courte durée, l'importance de l'impact est jugée **moyenne**

- **Site archéologique** : Le quartier Tarek Ibn Zied ne comporte aucun site archéologique ainsi en dehors de la zone du projet. Donc, on n'aura pas des impacts sur les patrimoines archéologiques de la zone.

7.2.2 Impacts positifs

7.2.2.1 Impact sur le milieu socio-économique

- **Population** : En phase de construction, un pic d'effectif de personnes travaillera sur le site puisque les travaux vont générer un certain nombre d'emplois directs ou indirects dans la zone du projet.

7.3 Impact de la phase d'exploitation

Cette phase concerne la mise en service des voies revêtues et réseau de drainage.

7.3.1 Impacts négatifs

7.3.1.1 Impact sur le milieu socio-économique

- **Santé et sécurité publique** : L'amélioration des voiries va augmenter les vitesses des engins motorisés ce qui a comme conséquence l'augmentation des risques d'accidents. L'importance de l'impact est jugée **moyenne**

7.3.2 Impacts positifs

7.3.2.1 Impact sur le milieu physique

- **Qualité de l'air** : Aucune émission atmosphérique n'est à signaler durant la phase d'exploitation. Au contraire, l'aménagement des voiries engendrait la réduction des poussières émises par la circulation des véhicules dans des rues avec des chaussées aménagées.
- **Paysage** : Toute intrusion de nouveaux éléments dans le champ visuel a un impact sur la qualité esthétique du paysage. Dans le cas de ce projet, le revêtement des pistes existantes aura un impact positif sur le paysage global de la zone.

7.3.2.2 Impact sur le milieu socio-économique

- **Sécurité routière** : Durant la phase exploitation, la réhabilitation de la voirie favorisera le trafic routier, ce qui aura comme conséquence un gain en temps pour la population locale.

Il y aurait également un développement d'échanges et par suite l'amélioration du transport dans le quartier (public et privé). L'aménagement des voiries permettra aussi à :

- Faciliter l'accès vers le quartier Tarek Ibn Zied et le rendre plus accessible ;
 - Améliorer le trafic routier qui sera fluide ou les usagers des voies réhabilitées éviteront les pertes de temps dans leurs déplacements ;
 - Permettre un approvisionnement plus aisé de quartier Tarek Ibn Zied en produits de première nécessité ;
 - Augmenter la fréquence de rotation des véhicules de collecte des ordures ménagères ;
 - Assurer une économie des dépenses de réparation et d'entretien de leurs véhicules dont les pannes étaient liées à l'état dégradé des voies pour les automobilistes ;
- **Santé et sécurité publique** : Lors de la phase exploitation, l'aménagement du quartier Tarek Ibn Zied offrira essentiellement :
- Une gestion meilleure de la collecte des ordures ménagères, ce qui va éviter la formation de dépôts anarchiques sur les voies et le bouchage des canalisations d'évacuation d'eaux usées et par conséquent d'éviter les risques sanitaires sur la population locale ;
 - Des accès faciles permettant une meilleure gestion des procédures d'entretien des voiries et des divers équipements ce qui va induire l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines ;
 - Une amélioration du drainage des voiries par l'aménagement de pentes adéquates et exhaussement des points bas ce qui va éviter la stagnation des eaux de surface, et donc les risques de transmissions de maladies hydriques.

8. MESURE DE MITIGATION

Comme présenté au chapitre précédent, la réalisation de ce projet va générer un certain nombre d'interactions sur l'environnement. Dans ce chapitre, nous allons présenter les mesures prévues par le réalisateur des travaux et l'ARRU pour prévenir ces impacts d'une part, et pour concilier le projet avec son environnement naturel d'autre part. Ces mesures se rapportent aussi bien à la phase des travaux que celle d'exploitation

8.1 Mesure pour la phase des travaux

8.1.1 Mesures prévues pour le milieu physique

8.1.1.1 Mesures d'atténuation pour la qualité de l'air

Les mesures d'atténuation qui seront adoptées pour réduire les émissions atmosphériques dans la zone du projet sont :

- Arrosage des zones exposées au vent, zones de stockage des matériaux de construction et des déblais, des pistes ouvertes, itinéraires et des zones fréquentées par les camions, etc., particulièrement pendant la saison sèche. La fréquence minimale d'arrosage est de 2 fois par jour et chaque fois que nécessaire pour respecter les valeurs limites de concentration des particules dans l'air conformément à la norme tunisienne relative à la qualité de l'air ambiant.
- Couverture des camions qui transportent des matériaux de construction, des déblais et des déchets ;
- Limitation de la vitesse de circulation des engins à 20 km/h à l'intérieur de l'emprise des travaux et de l'itinéraire emprunté par les camions de transport des matériaux dans le quartier et ses environs
- Réduction dans les mesures du possible des zones de stockages des déblais ;
- Ne pas stocker les déblais et les matériaux de construction au niveau des rues ;
- Aménager éventuellement une zone de stockage provisoire des matériaux, déblais (à l'abri des vents) et évacuation quotidienne des déblais excédentaires vers la décharge contrôlée ou vers un site autorisé. L'entreprise doit disposer des justificatifs de respect de cette exigence (P.ex. quittances délivrées par l'exploitant de la décharge contrôlée) ;
- Entretien régulier des engins et des équipements du chantier : Les engins doivent faire l'objet de contrôle technique conformément à la réglementation en vigueur. Les engins n'ayant pas fait ce contrôle (Absence d'attestation) seront interdit d'accès au chantier.

- Contrôle continu et de façon régulière de la consommation du carburant par les engins.

8.1.1.2 Mesures d'atténuation pour la qualité de sol

- Aménager un espace pour le stockage des matériaux de construction et le collecte des divers déchets inaptes afin de les évacuer vers la décharge contrôlée.
- Collecter les déblais excédentaires et des déchets de construction, et stockage sur un site réservé sur chantier et les évacuer vers une décharge appropriée ;
- Collecter et trier, sur site réservé, tous les déchets solides (plastique, déchets métalliques, du bois et cartons...)
- Prendre les dispositions nécessaires de manière à ce que les déblais extraits de la tranchée ne soient pas mélangés pas avec les terres arables pour éviter la réduction de fertilité des sols ;
- Collecter les huiles usagées dans des futs étanches répondant aux caractéristiques techniques et réglementaires (P.ex. celles du SOTULUB) et les livrer régulièrement aux collecteurs autorisés
- Contrôler régulièrement la consommation du carburant, l'état des réservoirs de stockage des huiles usagées, hydrocarbures et des bacs de rétention, etc.... ;
- Prévoir sur chantier le matériel nécessaire pour faire face et contenir rapidement les accidents de déversement accidentel d'huiles usagées, carburant, etc.
- Les opérations d'entretien doivent se faire dans un lieu approprié (garages, station de service, etc.) pour éviter toute contamination des sols par les hydrocarbures et les graisses à moteurs.
- Interdire le lavage des engins et véhicules sur le chantier.
- Réutiliser le sol extrait des tranchées pour le remblayage et le terrassement des voiries ;
- Prévoir des accès pour la circulation des véhicules et les engins du chantier pour éviter le risque de compactage et d'altération du sol ;
- Régaler la terre décapée lors des travaux de terrassement ;
- Utiliser les voies existantes pour éviter le compactage, l'érosion et la déformation du sol surtout durant l'étape de pose de la conduite du réseau de drainage.
- Restaurer et nettoyer les emprises des travaux à la fin du chantier.

8.1.1.3 Mesures d'atténuation pour les ressources en eaux superficielles et souterraines

- **Pour les eaux superficielles** : Pour faire face à l'ensemble des impacts sur les écoulements de surface et la pollution des eaux pluviales, les mesures d'atténuation suivantes seront mises en œuvre :
 - Éviter l'accumulation des terres sur les bordures des voiries et mettre les terres décapées dans les zones basses ;
 - Remblayer les tranchées après la pose des conduites et la remise à leur topographie initiale avant travaux ;
 - Utiliser au maximum les terres initialement décapées ;
 - Réutiliser les déblais excavés pour les travaux d'aménagement des voiries, de pose des conduites d'eau de drainage, de remblaiement des tranchées ;
 - Évacuer les déblais excédentaires vers un site autorisé ;
 - Restaurer et nettoyer les sites de chantier en rétablissant le profil original de la topographie des sols ;
- **Pour les eaux souterraines** : Lors de la période des travaux, les risques de pollution de la nappe sont occasionnés éventuellement par déversement d'eau polluée ou par fuites d'huiles et d'hydrocarbures des engins de terrassement. Les principales mesures d'atténuation prévues sont :
 - Limiter l'utilisation de substances dangereuses au maximum lors du chantier.
 - La bonne gestion des déchets solides et des rejets liquides dans la zone du projet
 - Mis en place d'un système de rétention lors du stockage des produits liquides polluants (Bac de rétention, zone imperméabilisé...)
 - La mise en place d'un programme d'entretien des engins et des équipements du chantier ;
 - Le contrôle continu et de façon régulière de la consommation du carburant ;
 - Prévoir sur chantier le matériel nécessaire pour faire face et contenir rapidement les accidents de déversement accidentel d'huiles usagées, carburant, etc.

8.1.1.4 Mesures d'atténuation pour la protection du paysage

Les mesures prises pour minimiser les impacts sur le paysage seront comme suit :

- Une organisation du chantier avec des zones dédiées aux différents stocks, déchets... ;
- La hauteur des stocks provisoires sera limitée afin d'éviter la gêne visuelle des riverains ;

- Les matériaux excavés seront stockés provisoirement dans une aire située sur le site de chantier pour être réutilisés pour le remblayage des tranchées et pour l'aménagement des voiries ou l'évacuer vers la décharge contrôlée ;
- Les déchets impropres seront évacués vers la décharge la plus proche ;
- La restauration et le nettoyage des emprises des travaux à la fin du chantier : l'entreprise doit nettoyer le chantier, collecter et évacuer tous les déchets, enlever les terres polluées et procéder à la remise en état des lieux. Ces mesures doivent être bien contrôlées par la commune et mentionnées dans le PV de réception des travaux.

8.1.2 Mesures prévues pour le milieu biologique

Les mesures prises pour minimiser les impacts sur le milieu biologique seront comme suit :

- Suivre les voies d'accès au site d'action pour éviter la destruction des habitats de la faune ;
- Respecter les itinéraires de circulation du personnel et des véhicules

8.1.3 Mesures prévues pour le milieu socio-économique

8.1.3.1 Mesure relative à l'utilisation du terrain pour les travaux

Dans le cas où l'entreprise envisage d'occuper temporairement un terrain privé pour le besoin des travaux (Installation de chantier, zone de stockage, etc.), elle doit établir un acte légal avec le propriétaire du terrain, précisant l'état et l'occupation initiale du terrain, la durée, la nature et les dates d'occupation provisoire. En cas d'occupation du domaine public (routier, hydraulique ou autres), l'entreprise doit en faire la demande à la partie concernée et obtenir l'autorisation d'occupation provisoire.

8.1.3.2 Mesures d'atténuation pour la santé et sécurité publique

Afin de minimiser et éliminer les impacts possibles lors des travaux d'aménagement du quartier Tarek Ibn Zied sur la santé et la sécurité publique, les mesures suivantes seront respectés :

- Sensibiliser et informer à l'avance la population locale : La commune de Mornaguia va assurer des réunions et une journée d'information avec la population du quartier Tarek Ibn Zied avant et durant les travaux pour une meilleur collaboration. Egalement, la commune utilisera les moyens adéquat pour le passage de l'information (Affichage de banderoles, publication dans le site web de la municipalité, contact direct par le biais d'El Omda, etc...) ;

- Installer toutes les signalisations nécessaires (nature des travaux, entreprise, maitres de l'ouvrage, durée des travaux, etc.....) ainsi que les coordonnées (adresse, téléphones, etc.) du responsable chargé de recevoir et traiter les plaintes des habitant du quartier et répondre à leurs interrogations ;
- Limiter la vitesse des engins sur le site afin de réduire les nuisances sur les gens ;
- Minimiser la durée des tranchées ouvertes, la largeur des fronts et prévoir les signalisations et les mesures de sécurité requise afin d'assurer une circulation/déplacement sécurisé des usages de la voirie et prévenir les accidents.
- Limiter les heures d'expositions des travailleurs aux bruits ;
- Equiper les ouvriers et toutes personnes autorisées à accéder aux zones des travaux d'EPI : casque, souliers de chantier, gants, chaussures de sécurité, lunettes, bouchons d'oreilles adéquat, boîte à pharmacie) et exiger leur port
- Mettre en place des moyens de communication et de transport, d'évacuation en cas d'accidents
- Sensibiliser et former les ouvriers et les intervenants sur le chantier sur les règles et les moyens de sécurité et sur la nécessité de respecter les consignes de sécurité ;
- Clôture, gardiennage et signalisation requise du chantier (jour et nuit).

8.1.3.3 Mesures relatives à la sécurité routière

Les mesures de protection pour la sécurité routière sont les suivantes :

- Bonne organisation du chantier
- L'entrepreneur établira un plan de circulation à l'intérieur du quartier ; Établira et mettra en œuvre un Plan approuvé par la commune et les autorités concernées ;
- Mettre en place des dispositifs de sécurité et la signalisation routière nécessaire (panneaux de signalisation, etc.) sur les pistes pour donner des renseignements relatifs aux déviations et accès au chantier ;
- L'avancement par petit tronçons pour éviter la perturbation des circulations et les longues tranchées ouvertes ;

8.1.3.4 Protection des infrastructures et constructions

Pour réduire les impacts négatifs sur les infrastructures et constructions, l'entrepreneur en concertation avec la municipalité prévoit les mesures de sécurité suivantes :

- Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur concertera avec les divers concessionnaires pour obtenir les plans des différents emplacements des infrastructures existantes (SONEDE, ONAS, STEG, etc...);
- Des précautions exigées par les concessionnaires devraient être prises en compte par l'entreprise pour éviter des accidents et la dégradation des réseaux ... ;
- Respecter des distances standards par rapport aux concessionnaires existant (STEG et SONEDE) ;
- Tout dégât au niveau des infrastructures rencontrées doit être réparé au fur et à mesure de l'avancement des travaux ;
- Durant les travaux, l'entrepreneur peut découvrir des infrastructures (canalisation d'eau, Conduite Gaz ...) non signalées sur les plans, donc, il avertira immédiatement la municipalité qui informera le concessionnaire concernée pour pouvoir prendre les mesures nécessaires lors des travaux ;

8.1.3.5 Mesures prévues pour l'agriculture

Pour réduire les impacts négatifs sur l'activité agriculture, les mesures sont les suivantes :

- Interdire l'arrachage des arbres fruitiers
- Suivre les voies d'accès au site d'action (entre les bordures nues des parcelles)
- Entamer, avant le démarrage des travaux du chantier, les procédures nécessaires pour obtenir l'autorisation de la part du propriétaire privé de la parcelle agricole pour le passage de la conduite de réseau de drainage des eaux pluviales dans la piste existante, sachant que l'ONAS est entrain d'utiliser cette piste pour le passage d'une conduite d'assainissement.

8.2 Mesure pour la phase d'exploitation

8.2.1 Mesures prévues pour le milieu physique

Vue l'absence d'impacts négatifs sur le milieu physique, aucune mesure spécifique n'est donc nécessaire.

8.2.2 Mesures prévues pour le milieu socio-économique

Comme présenté au chapitre précédent des impacts, le projet sera bénéfique à la population locale. Les seules mesures seront prises dans le domaine de la sécurité routière.

8.2.2.1 Mesures relatives à la santé et sécurité publique

Les mesures d'optimisation pour la réduction des risques d'accidents à mettre en œuvre consisteront à :

- Limiter les vitesses des véhicules à l'intérieur de quartier avec une signalisation adéquate et par la construction de dos d'ânes à l'entrée ;
- Installer des panneaux de signalisation routière à l'intérieur de quartier Tarek Ibn Zied ;
- Sensibiliser les riverains sur les conséquences de l'augmentation de la vitesse, et probablement de l'intensité, du trafic due à l'amélioration de l'état des voiries ;
- Sensibiliser les habitants du quartier de la nécessité de bien préserver les différentes composantes du projet (ne pas jeter des ordures dans les avaloires...)

9. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL

Le Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES), d'une part, constitue l'ensemble d'actions pour se conformer aux exigences de protection de l'environnement pendant la phase de construction et l'exploitation du projet.

D'autre part, le vis-à-vis de la point focal de la commune pour toutes les questions s'y rapportant.

L'entreprise désignera un responsable HSE qui sera chargé de la mise en œuvre du PGES pendant les travaux.

Le P.G.E.S est conçu pour faciliter l'organisation, la documentation, la communication, la formation, le contrôle et le suivi de la mise en place et de l'efficacité des actions réductrices, correctives et de compensation retenues. Il doit délimiter les responsabilités, identifier et proposer les moyens, les procédures et les techniques et estimer les coûts induits.

L'entreprise doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer un contrôle continu du respect de la réglementation en vigueur et des mesures environnementale et sociale du PGES. Elle doit désigner un responsable HSE du chantier, qui sera le vis à vis de la commune pour toute question ayant trait au PGES travaux. L'entreprise est tenu également d'installer un panneau, comprenant des informations en caractères lisibles, destiné aux habitants du quartier, sur les coordonnées (adresse, téléphones, etc.) du responsable chargé de recevoir et traiter leurs plaintes et répondre à leurs interrogations

Le PGES du projet est présenté sous forme d'un tableau dans les pages suivantes. Ces tableaux détaillent les mesures envisagées par le projet pour l'atténuation, le suivi et la gestion des impacts durant ses différentes phases. Le PGES est subdivisé selon les catégories suivantes :

- Activité génératrice d'impact ou facteur d'impact ;
- Nature des impacts prévisible par composante de l'environnement affecté (milieu physique, milieu socioéconomique, etc....) ;
- Mesures d'atténuation : mesures envisagées pour minimiser, si nécessaire, les impacts potentiels du projet ;
- Calendrier de mise en œuvre : période à laquelle sera réalisée la mesure préconisée du PGES
- Responsabilité d'application et de suivi : entité chargée de la mise en œuvre des mesures d'atténuation ;
- Coût et financement ;



9.1 Plan d'atténuation durant le projet

Le tableau suivant présente le coût prévisionnel des dépenses correspondantes aux mesures envisagées durant le projet :

Tableau 9-1: Plan d'atténuation

Phase	Principaux impacts		Mesures d'atténuation	Partie responsable	Date prévisionnelle	Coûts	
	Type, milieu	Impact					
Phase des travaux	Milieu physique	Qualité de l'air	<ul style="list-style-type: none"> • Dégradation de la qualité de l'air par l'émission des gaz d'échappement et la poussière 	<ul style="list-style-type: none"> • Arroser les zones exposées au vent, les zones de stockage des matériaux de construction et des déblais, des pistes ouvertes, les itinéraires et les zones fréquentées par les camions • Couvrir les camions qui transportent des matériaux de construction, des déblais et des déchets • Limiter la vitesse de circulation des engins à 20 km/h ; • Réduire dans les mesures du possible les zones de stockages des déblais ; • Ne pas stocker les déblais et les matériaux de construction au niveau des rues ; • Aménager éventuellement une zone de stockage provisoire des matériaux, déblais (à l'abri des vents) et évacuer quotidiennement les déblais excédentaires vers la décharge contrôlée ou vers un site autorisé ; • Entretenir régulièrement les engins et les équipements ; • Contrôler en continue et de façon régulière la consommation du carburant par les engins 	Entrepreneur sous la responsabilité de chef projet ARRU	Toute la période des travaux	inclus dans les prix du marché

Phase	Principaux impacts		Mesures d'atténuation	Partie responsable	Date prévisionnelle	Coûts
	Type, milieu	Impact				
	Qualité du sol	<ul style="list-style-type: none"> Contamination du sol Erosion du sol Compactage du sol 	<ul style="list-style-type: none"> Aménager un espace pour le stockage des matériaux de construction et le collecte des divers déchets inaptes afin de les évacuer vers la décharge contrôlée. Collecter les déblais excédentaires et des déchets de construction, et stockage sur un site réservé sur chantier et les évacuer vers une décharge appropriée ; Collecter et trier, sur site réservé, tous les déchets solides (plastique, déchets métalliques, du bois et cartons...) Prendre les dispositions nécessaires de manière à ce que les déblais extraits de la tranchée ne soient pas mélangés pas avec les terres arables pour éviter la réduction de fertilité des sols Collecter les huiles usagées dans des futs étanches répondant aux caractéristiques techniques et réglementaires (P.ex. celles du SOTULUB) et les livrer régulièrement aux collecteurs autorisés Contrôler régulièrement la consommation du carburant, l'état des réservoirs de stockage des huiles usagées, hydrocarbures et des bacs de rétention, etc.... 	Entrepreneur sous la responsabilité de chef projet ARRU	Toute la période des travaux	inclus dans les prix du marché



ETUDE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU LOT 8
RAPPORT FINAL DU PGES DU QUARTIER TAREK IBN ZIED – COMMUNE MORNAGUIA



Phase	Principaux impacts		Mesures d'atténuation	Partie responsable	Date prévisionnelle	Coûts
	Type, milieu	Impact				
			<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir sur chantier le matériel nécessaire pour faire face et contenir rapidement les accidents de déversement accidentel d'huiles usagées, carburant, etc. • Les opérations d'entretien doivent se faire dans un lieu approprié (garages, station de service, etc.) pour éviter toute contamination des sols par les hydrocarbures et les graisses à moteurs. • Interdire le lavage des engins et véhicules sur le chantier. • Réutiliser le sol extrait des tranchées pour le remblayage et le terrassement des voiries ; • Prévoir des accès pour la circulation des véhicules et les engins du chantier pour éviter le risque de compactage et d'altération du sol ; • Régaler la terre décapée lors des travaux de terrassement ; • Restaurer et nettoyer les emprises des travaux à la fin du chantier. 			
	Ressource en eaux :	<ul style="list-style-type: none"> • Perturbation du drainage superficiel des eaux pluviales. 	<p>Pour les eaux superficielles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éviter l'accumulation des terres sur les bordures des voiries et mettre les terres décapées dans les zones basses ; 	Entrepreneur sous la responsabilité	Toute la période des travaux	inclus dans les prix du marché

Phase	Principaux impacts		Mesures d'atténuation	Partie responsable	Date prévisionnelle	Coûts
	Type, milieu	Impact				
		<ul style="list-style-type: none"> Contamination des eaux par les hydrocarbures, des lubrifiants propres ou usagés, et des produits bitumineux 	<ul style="list-style-type: none"> Remblayer les tranchées après la pose des conduites et la remise à leur topographie initiale avant travaux ; Utiliser au maximum les terres initialement décapées ; Réutiliser les déblais excavés pour les travaux d'aménagement des voiries, de pose des conduites d'eau de drainage, de remblaiement des tranchées ; Évacuer les déblais excédentaires vers un site autorisé ; Restaurer et nettoyer les sites de chantier en rétablissant le profil original de la topographie des sols <p>Pour les eaux souterraines</p> <ul style="list-style-type: none"> limiter l'utilisation de substances dangereuses au maximum lors du chantier. La bonne gestion des déchets solides et des rejets liquides dans la zone du projet Mis en place d'un système de rétention lors du stockage des produits liquides polluants (Bac de rétention, zone imperméabilisé...) 	de chef projet ARRU		

Phase	Principaux impacts		Mesures d'atténuation	Partie responsable	Date prévisionnelle	Coûts
	Type, milieu	Impact				
			<ul style="list-style-type: none"> • La mise en place d'un programme d'entretien des engins et des équipements du chantier ; • Le contrôle continu et de façon régulière de la consommation du carburant ; • Prévoir sur chantier le matériel nécessaire pour faire face et contenir rapidement les accidents de déversement accidentel d'huiles usagées, carburant, etc. 			
		Paysage	<p>Changement au niveau de l'aspect paysager durant les travaux d'aménagement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Une organisation du chantier avec des zones dédiées aux différents stocks, déchets... ; • La hauteur des stocks provisoires sera limitée afin d'éviter la gêne visuelle des riverains ; • Les matériaux excavés seront stockés provisoirement dans une aire située sur le site de chantier pour être réutilisés pour le remblayage des tranchées et pour l'aménagement des voiries ou l'évacuer vers la décharge contrôlée ; • Les déchets impropres seront évacués vers la décharge la plus proche ; • La restauration et le nettoyage des emprises des travaux à la fin du chantier 	<p>Entrepreneur sous la responsabilité de chef projet ARRU</p>	<p>Toute la période des travaux et à la fin du chantier</p>

Phase	Principaux impacts		Mesures d'atténuation	Partie responsable	Date prévisionnelle	Coûts	
	Type, milieu	Impact					
	Milieu biologique	Faune et flore	<ul style="list-style-type: none"> Destruction de et habitats de la faune sauvage par les travaux d'ouverture de la tranchée d'enfouissement pour la pose de la conduite du réseau de drainage 	<ul style="list-style-type: none"> Suivre les voies d'accès au site d'action pour éviter la destruction des habitats de la faune ; Respecter les itinéraires de circulation du personnel et des véhicules ; 	Entrepreneur sous la responsabilité de chef projet ARRU	Toute la période des travaux et à la fin du chantier	inclus dans les prix du marché
	Milieu socio-économique	Santé et sécurité publique	<ul style="list-style-type: none"> Les nuisances sonores dues à la mobilisation et au fonctionnement des équipements du chantier Les vibrations dues aux matériels de travail Emissions de poussières liées aux travaux du chantier <p>Les accidents de travail liés aux vitesses des véhicules et engins de chantier</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sensibiliser et informer à l'avance la population locale Installer toutes les signalisations nécessaires (nature des travaux, entreprise, maitres de l'ouvrage, durée des travaux, etc.....) Limiter la vitesse des engins sur le site Minimiser la durée des tranchées ouvertes, la largeur des fronts et prévoir les signalisations et les mesures de sécurité requise Limiter les heures d'expositions des travailleurs aux bruits ; 	Entrepreneur sous la responsabilité de chef projet ARRU	Avant le démarrage et durant toute la période des travaux	inclus dans les prix du marché

Phase	Principaux impacts		Mesures d'atténuation	Partie responsable	Date prévisionnelle	Coûts
	Type, milieu	Impact				
			<ul style="list-style-type: none"> • Equiper les ouvriers et toutes personnes autorisées à accéder aux zones des travaux d'EPI : et exiger leur port • Mettre en place des moyens de communication et de transport, d'évacuation en cas d'accidents • Sensibiliser et former les ouvriers et les intervenants sur le chantier sur les règles et les moyens de sécurité ; Clôture, gardiennage et signalisation requise du chantier (jour et nuit).			
	Sécurité routière	<ul style="list-style-type: none"> • Perturbation du trafic routier • Destruction des accès riverains 	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne organisation du chantier • L'entrepreneur établira un plan de circulation à l'intérieur du quartier ; • Mettre en place des dispositifs de sécurité et la signalisation routière nécessaire (panneaux de signalisation, etc.) sur les pistes pour donner des renseignements relatifs aux déviations et accès au chantier ; • L'avancement par petit tronçons pour éviter la perturbation des circulations et les longues tranchées ouvertes ; 	Entrepreneur sous la responsabilité de chef projet ARRU	Toute la période des travaux	inclus dans les prix du marché

Phase	Principaux impacts		Mesures d'atténuation	Partie responsable	Date prévisionnelle	Coûts
	Type, milieu	Impact				
	Infrastructures et constructions	Dégâts temporels pour certaines infrastructures existant (poteau électrique,...)	<ul style="list-style-type: none"> • Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur concertera avec les divers concessionnaires pour obtenir les plans des différents emplacements des infrastructures existantes (SONEDE, ONAS, STEG, etc...); • Des précautions exigées par les concessionnaires devraient être prises en compte par l'entreprise pour éviter des accidents et la dégradation des réseaux ... ; • Respecter des distances standards par rapport aux concessionnaires existant (STEG et SONEDÉ) ; • Tout dégât au niveau des infrastructures rencontrées doit être réparé au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; • Durant les travaux, l'entrepreneur peut découvrir des infrastructures (canalisation d'eau, Conduite Gaz ...) non signalées sur les plans, donc, il avertira immédiatement la municipalité qui informera le concessionnaire concernée pour pouvoir prendre les mesures nécessaires lors des travaux ; 	Entrepreneur sous la responsabilité de chef projet ARRU	Toute la période des travaux	inclus dans les prix du marché

Phase	Principaux impacts		Mesures d'atténuation	Partie responsable	Date prévisionnelle	Coûts	
	Type, milieu	Impact					
		Agriculture	<ul style="list-style-type: none"> • Atteinte des cultures • La conduite de réseau de drainage des eaux pluviales va traverser une piste dans une terre agricole privée. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interdire l'arrachage des arbres fruitiers • Suivre les voies d'accès au site d'action (entre les bordures nues des parcelles) • Faire le nécessaire pour obtenir l'autorisation pour le passage de la conduite de réseau de drainage des eaux pluviales dans la terre agricole de propriétaire privée 	Entrepreneur sous la responsabilité de chef projet ARRU	Toute la période des travaux	inclus dans les prix du marché
Phase d'exploitation	Milieu physique		Pas d'impact	Pas de mesure spécifique			
	Milieu biologique		Pas d'impact	Pas de mesure spécifique			
	Milieu socio-économique	Santé et sécurité publique	l'augmentation des risques d'accidents	<ul style="list-style-type: none"> • Limiter les vitesses des véhicules à l'intérieur de quartier avec une signalisation adéquate et par la construction de dos d'ânes à l'entrée ; • Installer des panneaux de signalisation routière à l'intérieur de quartier Tarek Ibn Zied ; • Sensibiliser les riverains sur les conséquences de l'augmentation de la vitesse, et probablement de l'intensité, du trafic due à l'amélioration de l'état des voiries ; 	L'Agence de Réhabilitation et Rénovation Urbaine ARRU	Durant l'exploitation	3.000
Coût total du plan d'atténuation						3 000	

9.2 Plan de surveillance et suivi Environnemental

Suite à la réalisation du projet et pour assurer le suivi périodique de l'état de l'environnement du site, un plan de monitoring a été mis en place.

Les objectifs des plans de suivi seront les suivants :

- Surveiller la performance environnementale par rapport aux objectifs et aux exigences réglementaires ;
- Surveiller les émissions résultant des activités ;
- Surveiller les conditions environnementales et les comparer aux conditions de référence afin d'identifier les tendances ou impacts pouvant résulter d'événements naturels ou d'activités liées au projet ;

Les mesures d'atténuation environnementale et sociale proposées dans le cadre de PGES feront l'objet d'une surveillance afin d'assurer qu'elles sont bien mises en place et respectées au cours de

Les éléments suivants feront partie du suivi environnemental :

- Qualité de l'air et bruit ;
- Rejet hydrique ;
- Déchet solide.

Le Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental du projet de réhabilitation du quartier Tarek Ibn Zied comportera deux composantes :

- Un plan de Surveillance et de Suivi Environnemental pendant les travaux ;
- Un plan de Surveillance et de Suivi Environnemental pendant l'exploitation.

Tableau 9-2: Plan de suivi environnemental

Phase	Milieu récepteur	Paramètres de suivi	Lieux	Type/Programme de contrôle	Fréquence & mesures	Norme applicable	Responsabilité	Coûts estimatifs (DT)
Phase des travaux	Milieu physique	Poussière	Air ambiant au niveau des sources d'émission et au voisinage des habitations	Observation visuelle et Prélèvement et analyses des poussières (PM10) en cas de besoin	Journalière (observation visuelle) Mensuel (en cas d'analyse)	NT 106.04	Entrepreneur sous la responsabilité de chef projet ARRU	2000
		Rejets hydrique	Fûts étanche.	Observation visuelle	Journalière (observation visuelle)	NT 106.02	Entrepreneur sous la responsabilité de chef projet ARRU	-
		Déchets solides	Zones des stockages des matériaux collectés durant les travaux d'aménagement	Observation visuelle	Hebdomadaire	NT 41-96	Entrepreneur sous la responsabilité de chef projet ARRU	2000



ETUDE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU LOT 8
RAPPORT FINAL DU PGES DU QUARTIER TAREK IBN ZIED – COMMUNE MORNAGUIA



Phase	Milieu récepteur	Paramètres de suivi	Lieux	Type/Programme de contrôle	Fréquence & mesures	Norme applicable	Responsabilité	Coûts estimatifs (DT)
	Milieu Socio-économique	Bruit	Les différentes sources de bruit	Sonomètre	Trimestriel	NT 48.252 (1989) ENR Eqv CEI 651-1979	Entrepreneur sous la responsabilité de chef projet ARRUA	1500
Phase d'exploitation	Milieu physique	Qualité des voiries et les indices de signalisation	Zone du projet	Contrôle visuel	Trimestriel	-	L'Agence de Réhabilitation et Rénovation Urbaine ARRUA	-
Coût total du plan de suivi								5.500

9.3 Renforcement des capacités et formation

Un renforcement des capacités et de formations du personnel responsable pour la mise en œuvre du PGES est indispensable. Il est important de renforcer le responsable chargée de l'environnement par des formations relatives aux évaluations et à l'atténuation des impacts environnementaux des projets de réhabilitation du quartier Tarek Ibn Zied.

Tableau 9-3: Programme de renforcement des capacités

Nature de l'action	Bénéficiaires	Responsabilité	Calendrier	Coût (DT)
Formation				
Renforcement des capacités de l'ARRU dans le suivi de la mise en œuvre de PGES	Responsable PGES	L'Agence de Réhabilitation et Rénovation Urbaine ARRU	Avant le démarrage des travaux	2000
Assistance technique				
Assistance technique pour la mise en œuvre du PGES	Responsable PGES	L'Agence de Réhabilitation et Rénovation Urbaine ARRU	Avant le démarrage des travaux	3000
Coût total				5 000

Les estimations des dépenses correspondantes à la mise en place d'un PGES sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 9-4: Coût de la mise en place d'un PGES

Action	Coût (DT)
Atténuation	3 000
Suivi	5 500
Renforcement des capacités	5 000
TOTAL	13 500

10. Consultation publique

Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et d'habitat des populations des quartiers populaires, l'ARRU a été chargée par les communes comme maître d'ouvrage délégué pour les projets indiqués dans les TDR rentrant dans le cadre du Programme de Réhabilitation des Quartiers Populaires pour la Réduction des Disparités Régionales et dont le financement est assuré par la Banque Mondiale dans le cadre du Programme de Développement Urbain et de la Gouvernance Locale (PDUGL).

Ces projets visent l'amélioration des conditions de vie dans ces quartiers par l'aménagement des infrastructures.

Dans le cadre de l'établissement de plan de gestion environnementale et sociale pour le projet de réhabilitation du quartier Tarek Ben Zied de la municipalité de Mornaguia et conformément aux procédures de la Banque Mondiale, une journée de consultation du public a été organisée le 30 novembre 2016.

La séance s'est déroulée en deux parties :

- Une première partie a été consacrée à l'exposé de l'objectif de cette étude et le contenu du projet ainsi que les résultats de PGES ;
- Une seconde partie pendant laquelle, questions et réponses ont été échangées entre les présents et les conférenciers ;

Les présents proviennent de diverses institutions (cadres de la municipalité, Société civile,)

L'objectif de la consultation publique est de :

- Fournir aux participants le maximum d'informations sur le projet ;
- Expliquer l'importance de PGES pour la réalisation de projet ;
- Présenter les résultats de PGES ;
- Consulter les avis du public cible (Responsables, Population et riverains, etc...) ;
- Recueillir auprès des participants leurs avis et leurs suggestions ;
- Évaluer les inquiétudes exprimées ;
- Enrichir le contenu de PGES, objet du présent projet au vu des résultats les plus pertinents des discussions qui se sont articulées autour de cet objectif.

A la fin de l'exposé, le Président de la Délégation Spéciale a donné la parole aux participants. Un compte rendu du déroulement de la consultation publique est en annexe.

11. Annexe

Compte rendu du déroulement de la consultation publique du projet de réhabilitation du quartier Tarek Ibn Zied commune El Mornaguia : Le 30/11/2016 :

SYNTHESE DU DEROULEMENT DE LA CONSULTATION

Après l'ouverture de la réunion, Mr. Adel YAKOUB, représentant de la Commune de Mornaguia a présenté les caractéristiques du projet et la mission du bureau d'étude, par la suite Mr. Sami ABID, Chef du projet de l'étude auprès du bureau I2E, a ensuite souligné l'importance de la consultation publique dans l'élaboration des PGES de nouveaux projets pour la prise en compte aussi bien des aspects environnementaux et sociaux dans l'évaluation des projets. La présentation de Mr. Sami Abid est annexée au présent rapport.

La parole a été ensuite donnée à l'audience pour recueillir les avis et préoccupations des participants au sujet du projet de la réhabilitation du quartier Tarek Ben Zied. La plupart des intervenants ont exprimé l'importance du projet pour l'amélioration de la condition de vie dans ce quartier.

Plusieurs questions, remarques, suggestions et commentaires se rapportant au projet ont été exprimés. Les points évoqués peuvent être résumés dans ce qui suit :

- L'apport hydrique provenant du quartier El Mestiri présente une cause majeure pour le problème de drainage des eaux pluviales. L'ARRU a-t-elle donc pris en considération cet apport pour le dimensionnement de réseau de drainage ?
- Après le démarrage des travaux, y aurait-il un superviseur sur site pour assurer la bonne qualité des travaux et la conformité des matières premières qui seront utilisées surtout pour la réhabilitation des voies ?
- Quel sont les avantages d'installer un conduite de drainage des eaux pluviales au lieu d'un dalot ?
- Les participants souhaitent avoir des informations précises concernant la date de démarrage du projet et la durée des travaux.
- Les participants insistent sur l'importance d'informer les propriétaires des lots destinés à la construction pour éviter tout type des travaux de raccordement (ONAS, STEG ou SONEDE) après la fin des travaux du projet.

I2E
EPPM GROUP

ar ru

وكالة التهذيب والتجديد العمراني
بلدية المرقانية

**اعداد مخطط تصرف بيئي واجتماعي لمشروع تهيئة وتهذيب
حي طارق بن زياد**

الموضوع: استشارة عمومية
المكان : بلدية المرقانية
التاريخ : 30 نوفمبر 2018

1



I2E
EPPM GROUP




ar ru



برنامج العرض

- هدف الدراسة
- منطقة الدراسة
- تقديم المشروع موضوع الدراسة
- التأثيرات البيئية للمشروع والاجراءات اللازمة للحد منها



Liste des présents

ID	Participant	Institution	Numéro de téléphone	Email
1	جمال الشريعة		98539399	
2	محمد صالح فرحاتي			
3	بلال حامد السليبي		20281725	
4	جمال الطوحيان		20271529	
5	محمد انقري		26639866	
6	البلال الرباعي		94851455	
7	أحمد المصباح		96330809	
8	محمد اللوي			
9	عبد الله المورج			
10	علي العباري		95281518	
11	محمد صالح بن صالح		25180620	
12	السيد المنى خلاص		92328317	
13	كرام بن بشار		22155638	
14	يونس الرباعي			
15	فرحاتي العزيمي		55893702	
16	صبروك موشر		99150081	

ID	Participant	Institution	Numéro de téléphone	Email
17	الطالبة الراحمة		32-432854	
18	م. م. م. م. م.			
19	Yokim S Adel	Commune Mornaguia	22604349	
20	Sami ABID	I2E	96264362	
21	Amira SAIDI	I2E		
22	Najjar Haroun	I2E	21.435.145	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

Dossier photographique de la journée de la consultation du publique





Société d'Ingénierie de l'Environnement et de
l'Energie S.A



Agence de Réhabilitation et de Rénovation
Urbaine

N° Doc. I2E

AF13-16_Rpt_consultation publique

Rév. : 0

Page : 20

Date : 02/12/2016

**PROGRAMME DE REHABILITATION DES QUARTIERS POPULAIRES
POUR LA REDUCTION DES DISPARITES REGIONALES**

**ETUDE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
DANS 29 QUARTIES REPARTIS EN 10 LOTS**

**LOT 8 : TEBOURBA, MORNAGUIA, OUED ELLIL, EI FAHS
QUARTIER TAREK BEN ZIED - MORNAGUIA**

Rapport de consultation publique

<i>REV</i>	<i>DATE</i>	<i>Emetteur</i>	<i>Vérificateur</i>	Approbateur
0	02/12/2016	MN	SA	AGH

Table des matières

1	INTRODUCTION	4
2	OBJET DE LA CONSULTATION PUBLIQUE	5
3	SYNTHESE DU DEROULEMENT DE LA CONSULTATION	6
4	LISTE DES PARTICIPANTS.....	7
5	ANNEXES.....	9
5.1	PHOTO THEQUE : PHOTOS PRISES DE LA JOURNEE DE CONSULTATION PUBLIQUE.....	9
5.2	PRESENTATION I2E.....	13

Abréviations usuelles

Abréviation	Définition
ARRU	Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine
TDR	Terme De Référence
PDUGL	Programme de Développement Urbain et de la Gouvernance Locale
PGES	Plans de Gestion Environnementale et Sociale
ONAS	Office National de l'Assainissement
STEG	Société Tunisienne de l'Electricité et Gaz
SONEDE	Société Nationale d'Exploitation et Distribution d'Eau

	ETUDE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE QUARTIER TAREK BEN ZIED-MORNAGUIA RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE	Date : 02/12/2016
		Réf. : AF 13/16 Rév. : 0 Page : 4/20

1 INTRODUCTION

Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et d'habitat des populations des quartiers populaires, l'ARRU a été chargée par les communes comme maître d'ouvrage délégué pour les projets indiqués dans les TDR rentrant dans le cadre du Programme de Réhabilitation des Quartiers Populaires pour la Réduction des Disparités Régionales et dont le financement est assuré par la Banque Mondiale dans le cadre du Programme de Développement Urbain et de la Gouvernance Locale (PDUGL).

Ces projets visent l'amélioration des conditions de vie dans ces quartiers par l'aménagement des infrastructures.

Dans le cadre de l'établissement de plan de gestion environnementale et sociale pour le projet de réhabilitation du quartier Tarek Ben Zied de la municipalité de Mornaguia et conformément aux procédures de la Banque Mondiale, une journée de consultation du public a été organisée le 30 novembre 2016.

La séance s'est déroulée en deux parties :

- Une première partie a été consacrée à l'exposé de l'objectif de cette étude et le contenu du projet ainsi que les résultats de l'étude ;
- Une seconde partie pendant laquelle, questions et réponses ont été échangées entre les présents et les conférenciers ;

Les présents proviennent de diverses institutions (cadres de la municipalité, Société civile,).

	ETUDE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE QUARTIER TAREK BEN ZIED-MORNAGUIA RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE	Date : 02/12/2016 Réf. : AF 13/16 Rév. : 0 Page : 5/20
--	---	---

2 OBJET DE LA CONSULTATION PUBLIQUE

L'objectif de la consultation publique est de :

- Fournir aux participants le maximum d'informations sur le projet ;
- Expliquer l'importance de PGES pour la réalisation de projet ;
- Présenter les résultats de PGES ;
- Consulter les avis du public cible (Responsables, Population et riverains, etc...) ;
- Recueillir auprès des participants leurs avis et leurs suggestions ;
- Évaluer les inquiétudes exprimées ;
- Enrichir le contenu de PGES, objet du présent projet au vu des résultats les plus pertinents des discussions qui se sont articulées autour de cet objectif.

	ETUDE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE QUARTIER TAREK BEN ZIED-MORNAGUIA RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE	Date : 02/12/2016
		Réf. : AF 13/16 Rév. : 0 Page : 6/20

3 SYNTHÈSE DU DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION




Après l'ouverture de la réunion, Mr. Adel YAKOUB, représentant de la Commune de Mornaguia a présenté les caractéristiques du projet et la mission du bureau d'étude, par la suite Mr. Sami ABID, Chef du projet de l'étude auprès du bureau I2E, a ensuite souligné l'importance de la consultation publique dans l'élaboration des PGES de nouveaux projets pour la prise en compte aussi bien des aspects environnementaux et sociaux dans l'évaluation des projets. La présentation de Mr. Sami Abid est annexée au présent rapport.


La parole a été ensuite donnée à l'audience pour recueillir les avis et préoccupations des participants au sujet du projet de la réhabilitation du quartier Tarek Ben Zied. La plupart des intervenants ont exprimé l'importance du projet pour l'amélioration de la condition de vie dans ce quartier.

Plusieurs questions, remarques, suggestions et commentaires se rapportant au projet ont été exprimés. Les points évoqués peuvent être résumés dans ce qui suit :

- ✓ L'apport hydrique provenant du quartier El Mestiri présente une cause majeure pour le problème de drainage des eaux pluviales. L'ARRU a-t-elle donc pris en considération cet apport pour le dimensionnement de réseau de drainage ?
- ✓ Après le démarrage des travaux, y aurait-il un superviseur sur site pour assurer la bonne qualité des travaux et la conformité des matières premières qui seront utilisées surtout pour la réhabilitation des voies ?
- ✓ Quel sont les avantages d'installer un conduite de drainage des eaux pluviales au lieu d'un dalot ?
- ✓ Les participants souhaitent avoir des informations précises concernant la date de démarrage du projet et la durée des travaux.
- ✓ Les participants insistent sur l'importance d'informer les propriétaires des lots destinés à la construction pour éviter tout type des travaux de raccordement (ONAS, STEG ou SONEDE) après la fin des travaux du projet.

4 LISTE DES PARTICIPANTS

ID	Participant	Institution	Numéro de téléphone	Email
1	نسيم الخشروحي		98539399	
2	محمد صالح فرحاتي			
3	بلخاسم البليطي		20284725	
4	جمال الطوحيار		20271529	
5	حمزة الشقري		26639666	
6	البلال الرباعي		94851455	
7	أحمد الغنيص		96330809	
8	محمد اللوي			
9	عبدالله الهويدي			
10	علي العياري		95281518	
11	محمد صالح بن سوار		25180062	
12	لسيف الدين بلال		92328317	
13	كراند بن جابر		22155638	
14	يونس الرازي			
15	فراق علي الغزالي		55893702	
16	صبروك موش		99550081	

ID	Participant	Institution	Numéro de téléphone	Email
17	الطابق الرابع		82 438 854	
18	مؤسسة			
19	Yokou Abdel	Commune Mornaguia	22 604 349	
20	Sami ABID	I2E	96264362	
21	Amira SATDI	I2E		
22	Naïfar Haroun	I2E	21.435.145	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

5 ANNEXES

5.1 Photothèque : Photos prises de la journée de consultation publique









5.2 Présentation I2E

I2E

arfu

وكالة التهذيب والتجديد العمراني
بلدية المرناقية

**اعداد مخطط تصرف بيئي واجتماعي لمشروع تهيئة وتهذيب
حي طارق بن زياد**

الموضوع: استشارة عمومية
المكان : بلدية المرناقية
التاريخ : 30 نوفمبر 2016

1

I2E

arfu

برنامج العرض

- هدف الدراسة
- منطقة الدراسة
- تقديم المشروع موضوع الدراسة
- التأثيرات البيئية للمشروع والاجراءات اللازمة للحد منها

هدف الدراسة

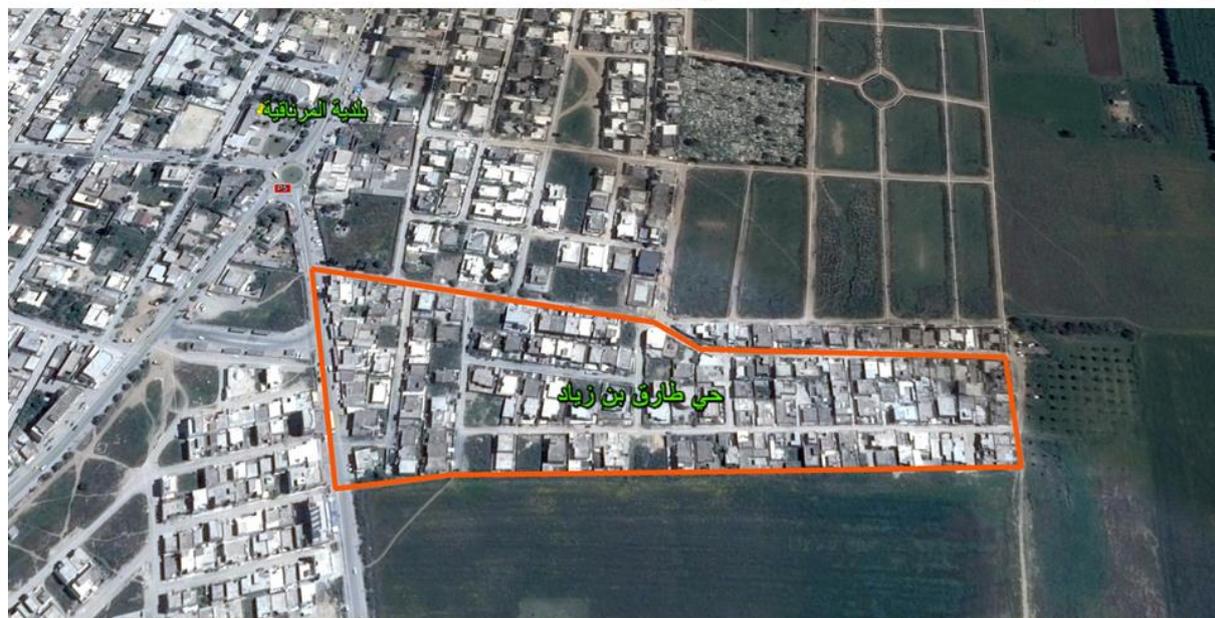
تهدف هذه الدراسة اساسا الى :

- ✓ تحديد التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع
- ✓ تطوير الاجراءات المخففة لأي ضرر محتمل ضمن المشروع
- ✓ حماية الناس من الاخطار الناجمة عن سوء نوعية الهواء والماء بالإضافة الى حمايتهم من الضجة
- ✓ التخلص المناسب من الملوثات
- ✓ تامين السكان من تأثير الاضرار الناجمة عن مختلف مراحل المشروع (مرحلة الاشغال ومرحلة الاستغلال)



منطقة الدراسة

يقع حي طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية لبلدية المرناقية ويمتد على مساحة قدرها 6 هكتارات كما يبلغ عدد سكان هذا الحي 1050 ساكن مقسمين على 210 مسكن. وقد وقع ادراج هذا الحي ضمن مشروع اعادة تهيئة الاحياء الشعبية وذلك للحد من التفرقة الاجتماعية والاقليمية والذي تشرف عليه وكالة التهذيب والتجديد العمراني.



يتمثل مشروع تهيئة حي طارق بن زياد اساسا في :
❖ اعادة تهيئة وتعبيد 1696 متر من طرقات الحي
❖ تركيز شبكة لتصريف مياه الامطار على امتداد 1400 متر
و من المزمع انطلاق الأشغال مع بداية سنة 2017 لتتواصل
كتقدير أولي على مدى 6 أشهر
و تبلغ القيمة الجمالية للمشروع 1000439,94 دينار تونسي



❖ اعادة تهيئة وتعبيد طرق الحي



صور لبعض النقاط السوداء التي تم تحديدها اثناء الزيارة الميدانية



❖ تركيز شبكة لتصريف مياه الامطار



صور لبعض نقاط ركود مياه الامطار نظرا لغياب شبكة تصريف و الحالة المتردية للطرق





التأثيرات البيئية للمشروع والاجراءات اللازمة للحد منها



□ مرحلة الأشغال

- الانبعاثات في الهواء : الانبعاثات في الغلاف الجوي من الغازات والغبار مصدرها المعدات والآلات والشاحنات المستخدمة من قبل شركة التنفيذ هي شكل من أشكال التلوث الذي سيكون مصدر إزعاج لسكان الحي لكن سيتم تقليلها بفعالية من خلال الممارسات الإدارية الجيدة بمواقع التنفيذ، وتطبيق إجراءات التخفيف اللازمة.
- انتشار الضجيج : يمكن ان يحصل الضجيج عند القيام بالأشغال خاصة عند إزالة طبقة الإسفلت وتفتيت الصخور التي قد تعترض مسار الأنابيب لكن الضجيج لا يمكن التخفيف منه لذلك يتوجب على المقاول تقييد الأشغال ليلا.
- تلوث المياه و التربة : تخزين مواد معينة من البناء مثل الاسمنت والمحروقات المستخدمة في تشغيل المعدات، يمكن أن تكون مصدرا لتلوث التربة والمياه الجوفية. هذه المواد المخزنة في مناطق غير محمية (بدون مأوى ضد جريان مياه الأمطار أو نفاذية التربة)، يمكن لهذه المنتجات لتلوث التربة والمياه السطحية المستغلة في مجال الأراضي الزراعية والتسرب العميق للمياه الجوفية. وترتبط هذه الحوادث البيئية لمنتجات التخزين بعدم الامتثال لقواعد التخزين و عن سوء إدارة الموقع ومرافقه. لذلك و تجنباً لمثل هذه التأثيرات على البلدية ان توفر للمقاول مأوى مهياً او مساحة ذات خصائص تمنع تسرب المواد المستعملة اثناء الأشغال او صيانة المعدات.



التأثيرات البيئية للمشروع والاجراءات اللازمة للحد منها

- تعطيل الحركة المرورية: سوف تؤدي الأشغال المختلفة بالحي إلى تكثيف و تعطيل الحركة المرورية حيث أنها ستؤدي لإغلاق بعض الشوارع لفترات قصيرة و هو ما قد قد يعيق المواطنين أو يتسبب في وقوع حوادث. ولهذا السبب يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لذلك نذكر منها وضع الاشارات و العلامات المرورية الدالة على وجود اشغال كما يجب الاعلام المسبق للمواطنين عند غلق احد الأنهج.
- الصحة المهنية : الامتثال لقواعد السلامة المهنية بتمكين كافة العمال من الخوذات والقفازات وأحذية السلامة.
- تضرر البنية التحتية: نظرا لوجود شبكة صرف صحي و أعمدة الكهرباء و الانارة يتوجب على المفاوض توخي الحذر خاصة اثناء عمليات الحفر لتجنب الحاق اضرار بهذه البنية كما عليه تحمل مسؤولية اصلاحها ان وقع الضرر.



14

التأثيرات البيئية للمشروع والاجراءات اللازمة للحد منها

□ مرحلة الاستغلال

بعد انتهاء الأشغال و دخول الطرقات المعبدة و قنوات التصريف حيز الاستغلال فان المستفيد الأول من هذا المشروع هو متساكنو الحي بالأساس و هو ما سيجعلهم المسؤول الأول لضمان استمرارية و سلامة البنية التحتية و ذلك بتقديدهم بعدد السلوكيات التي نذكر من بينها :

- تجنب رمي الفضلات في قنوات تصريف المياه و هو ما يؤدي الى انسدادها و بالتالي فيضان المياه
- احترام سرعة السياقة المحددة بداخل الأحياء السكنية لضمان سلامة المتساكنين و خاصة المترجلين منهم .

كما ان البلدية تعتبر المسؤول الثاني على سلامة البنية التحتية بالحي و ذلك بحرصها على القيام بأشغال الصيانة خاصة على مستوى شبكة تصريف مياه الأمطار نظرا لأهمية كمية الأمطار الموسمية التي تهطل بالمنطقة.



15

الهدف من الاستشارة

تهدف هذه الاستشارة بالأساس بتشريك مختلف مكونات المجتمع سواء كانوا من المستفيدين او الادارات والمؤسسات المعنية او الجمعيات او المجتمع المدني و ذلك للتعرف على تطلعاتهم و مشاغلهم و الاستماع الى مقترحاتهم في ما يتعلق بالمشروع سابق الذكر.



شكرا على الحضور

تساؤلاتكم و اقتراحاتكم

